



**Status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier**  
**Årsrapportering til Folketingets Finansudvalg 2014**



## Indhold

Indledning.....	5
Statslig medfinansiering af en ny hospitalsstruktur .....	5
Oversigt for de 16 kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier .....	6
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilsyn .....	7
Læsevejledning til projektbeskrivelser .....	11
Nyt Hospital Bispebjerg.....	12
Nyt Hospital Herlev .....	13
Nyt Hospital Nordsjælland .....	14
Nyt Hospital Hvidovre .....	15
Det Nye Rigshospital .....	16
Ny Retspsykiatri Sct. Hans .....	17
Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) .....	18
Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup (DNU).....	19
Regionshospitalet Viborg .....	20
Nyt Aalborg Universitetshospital .....	21
Universitetssygehus Køge .....	22
Psykiatri i Slagelse .....	23
Slagelse Sygehus (somatik) .....	24
Kolding Sygehus .....	25
Nyt Universitetshospital i Odense (OUH) .....	26
Aabenraa Sygehus .....	27



## **Indledning**

Status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier 2014 giver en orientering til Folketingets Finansudvalg om omfang, status og udvikling i de regionale sygehusbyggerier, som modtager tilskud fra den statslige kvalitetsfond.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har med henblik på at orientere om rammerne for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilskudsadministration og tilsyn den 15. juni 2011 oversendt administrationsgrundlag for ordningen til Folketingets Finansudvalg. Det fremgår i forbindelse med oversendelsen, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse årligt vil orientere Finansudvalget om status for kvalitetsfondsprojekterne.

## **Baggrund**

Der var med aftalen om regionernes økonomi for 2008 enighed om, at der er behov for strukturændringer i sygehusvæsenet og heraf følgende investeringer i fysiske tilpasninger, ny teknologi og apparatur for at realisere målsætningen om et tidssvarende og bæredygtigt sygehusvæsen.

Det blev endvidere aftalt at nedsætte et ekspertpanel, der skulle vurdere de konkrete større anlægsprojekter i forhold til en række i økonomiaftalen fastlagte principper vedrørende samling af enheder, driftsøkonomisk rentabilitet, effektivitet og kvalitet.

På den baggrund er der oprettet en statslig kvalitetsfond med 25 mia. kr. Regionerne medfinansierer selv 16,4 mia. kr., så den samlede investering bliver på 41,4 mia. kr. (09-PL). Dertil er det i økonomiaftalen for 2013 besluttet at etablere en lånepulje på ca. 1 mia. kr. til energirigtige investeringer i kvalitetsfondsprojekterne. Den samlede investeringsramme kan på den baggrund blive op til 42,4 mia. kr. Det er regionerne, der har bygherreansvaret for de enkelte kvalitetsfondsbyggerier.

## **Statslig medfinansiering af en ny hospitalsstruktur**

Regeringen tildeler midler fra kvalitetsfonden til regionerne på baggrund af indstillinger fra ekspertpanelet, som er regeringens rådgivende udvalg om sygehusinvesteringer. Der er meddelt foreløbigt og endeligt regeringstilsagn til alle 16 projekter. I forlængelse heraf er arbejdet for regeringens ekspertpanel (også kendt som Erik Juhl udvalget) afsluttet.

Ved både foreløbigt og endeligt tilsagn er fastsat en totalramme, som er den maksimale udgift regionerne må bruge på at opføre et tidssvarende og fuldt funktionsdygtigt hospital. Totalrammen er gældende i hele projektperioden, og der foretages ikke besparelser i totalrammen fra statens side. De ændringer, der eventuelt sker i projekterne, er prioriteringer og omdisponeringer foretaget af bygherre inden for totalrammen. Den økonomiske totalramme sikrer, at der også er midler til øvrige regionale anlægsprojekter, som ikke er støttet af kvalitetsfonden, ligesom den fremmer nødvendige omkostningseffektive og innovative løsninger.

Totalrammen består af kvalitetsfondsmidler (59,8 %), mens regionerne selv finansierer den resterende del. Det sker dels ved en regional deponering, dels via låneadgang (op til 12,5 %), som regionerne bl.a. kan finansiere ved fremtidigt salgsprovenu fra nedlagte hospitalsbygninger. Ved udbetalingsanmodning får alle projekter

lavet en udbetalingsprofil, hvor et afgørende hensyn er, at statslige midler ikke ophobes i regionerne. I udbetalingerne fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse vil den konkrete fordeling mellem de tre finansieringskilder derfor variere over tid og for de enkelte projekter. For den enkelte region vil den samlede finansiering svare til fordelingen ovenfor. Såfremt en region ansøger om adgang til energilånepuljen vil ovenstående fordeling blive påvirket, idet låneandelen øges. Den konkrete fordeling afhænger af, hvor stort et lånebeløb der ansøges om.

### Oversigt for de 16 kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier

De 16 kvalitetsfondsprojekter er fordelt på de fem regionale bygherrer, *jf. tabel 1*. Ud for hvert projekt er først regeringens økonomiske tilsagnsramme angivet. Tilsagnsrammen indikerer den initiale maksimale udgift, som regionen må bruge på at opføre et tidssvarende og fuldt funktionsdygtigt hospital. I den korrigerede tilsagnsramme fremgår ny totalramme som følge af godkendte energilån, *jf. regeringens energilånepulje i ØA13*.

Dernæst er projektets status angivet i forhold til, om projektet har endeligt tilsagn, der er påbegyndt udbetaling af kvalitetsfondsmidler eller projektet er ibrugtaget.

Den sidste kolonne viser via trafiklys, hvilken form for tilsyn Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har godkendt udbetalingsansøgningen fra otte projekter. Disse projekter rapporterer derfor kvartalsvist til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Kvalitetsfondsprojektet Slagelse Sygehus (somatik) er som det første kvalitetsfondsprojekt fuldt ibrugtaget. Der udestår dog endelig regnskabsaflæggelse.

Tabel 1: Oversigtstabel for de 16 kvalitetsfondsprojekter (pr. 1. oktober 2014).

	Tilsagnsramme (mio. kr. 09-PL)	Korrigeret tilsagnsramme (mio. kr. 09-PL)	Status	SUM's tilsyn
<b>Region Hovedstaden</b>	<b>12.850</b>	<b>12.855</b>		
Nyt Hospital Bispebjerg	2.950	-	Endeligt tilsagn	Faserapportering
Nyt Hospital Herlev	2.250	-	Endeligt tilsagn (udbetalingsansøgning i proces)	Faserapportering
Nyt Hospital Nordsjælland	3.800	-	Endeligt tilsagn	Faserapportering
Nyt Hospital Hvidovre	1.450	-	Endeligt tilsagn	Faserapportering
Det Nye Rigshospital	1.850	1.855	Udbetaling af tilskud	Kvartalsvis rapportering
Ny Retspsykiatri Sct. Hans	550	-	Endeligt tilsagn	Faserapportering
<b>Region Midtjylland</b>	<b>10.650</b>	<b>10.837</b>		
Det Nye Universitetshospital i Aarhus	6.350	6.451	Udbetaling af tilskud	Kvartalsvis rapportering samt tættere opfølgning
Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup	3.150	3.222	Udbetaling af tilskud	Kvartalsvis rapportering
Regionshospitalet Viborg	1.150	1.164	Udbetaling af tilskud	Kvartalsvis rapportering
<b>Region Nordjylland</b>	<b>4.100</b>	-		

Nyt Aalborg Universitetshospital	4.100	-	Endeligt tilsagn	Faserapportering
<b>Region Sjælland</b>	<b>5.350</b>	<b>5.410</b>		
Universitetssygehus Køge	4.000	-	Endeligt tilsagn	Faserapportering
Psykiatri i Slagelse	1.050	1.110*	Udbetaling af tilskud	Kvartalsvis rapportering
Slagelse Sygehus (somatik)	300	-	Ibrugtagning	Afventer anlægsregnskab
<b>Region Syddanmark</b>	<b>8.450</b>	<b>8.477</b>		
Kolding Sygehus	900	912	Udbetaling af tilskud	Kvartalsvis rapportering
Nyt Universitetshospital i Odense	6.300	-	Endeligt tilsagn	Faserapportering
Aabenraa Sygehus	1.250	1.264	Udbetaling af tilskud	Kvartalsvis rapportering samt tættere opfølgning
<b>I alt</b>	<b>41.400</b>	<b>41.678</b>		

\*I den korrigerede tilsagnsramme indgår for Psykiatri i Slagelse et beløb på 60 mio. kr. til sikringsmæssige installationer, som er accepteret afholdt af Region Sjællands almindelige anlægsramme.

### Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilsyn

Kvalitetsfondsmidler ydes som statsligt tilskud. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører derfor tilsyn med byggerierne, jf. Moderniseringsstyrelsens vejledning om effektiv tilskudsforvaltning.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse tilser, at de enkelte projekter lever op til regeringens tilsagnsbetingelser, og at de er robuste og realiserbare inden for den økonomiske totalramme, der er bindende for det enkelte projekt.

Det er herunder en tilsagnsbetingelse, at en bestemt andel af totalrammen reserveres til it, udstyr, apparatur mv. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse tilser bl.a., at denne andel fastholdes i det enkelte projekt.

Ligeledes er det en tilsagnsbetingelse, at der på baggrund af investeringerne opnås effektiviseringsgevinster, som skal realiseres i år 1 efter ibrugtagelsen af det nye hospital, og at gevinsten vil indgå som finansieringsbidrag af ny sygehusaktivitet og dermed ikke indgår i finansieringen af byggerierne. Effektivitetskravene ligger ud over de almindelige årlige produktivitetskrav.

### Tilsynets organisering

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har et kontor til at forestå ministeriets tilskudsadministration og tilsyn med kvalitetsfondsprojekterne. Kontoret har som hovedopgave løbende at vurdere kvalitetsfondsprojekternes realiserbarhed i forbindelse med den kvartalsvise udbetaling af kvalitetsfondsmidler.

Der er i foråret 2013 udarbejdet et opdateret administrationsgrundlag, der skitserer rammerne for det statslige tilsyn. Administrationsgrundlaget er udfoldet i en regnskabs- og revisionsinstruks, som opdateres årligt.

**Ordinært tilsyn og tættere opfølgning**

Når en region har fået endeligt tilsagn til et projekt, indsendes der standardrapportering til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. For projekter, der har fået endeligt tilsagn, men som endnu ikke har fået udbetalt statslige kvalitetsfondsmidler, omfatter standardrapporteringen grundlæggende projektoplysninger ved faseovergange i projektet.

For projekter som modtager udbetaling af statslige kvalitetsfondsmidler, omfatter standardrapporteringen en kvartalsvis rapportering til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse efter forudgående godkendelse i regionsrådet. Rapporteringen indeholder status for risici og reserver, økonomi, fremdrift samt kvalitet og indhold. Ligeledes omfatter standardrapporteringen for disse projekter en årlig rapportering om de specifikke tilsagnsforudsætninger.

Såfremt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ikke er fuldt betrygget i et projekts robusthed og realiserbarhed, har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse mulighed for at skærpe tilsynet. Sanktionerne kan f.eks. være krav om hyppigere rapportering, øget detaljeringsgrad i rapportering eller at sætte udbetaling af kvalitetsfondsmidler i bero.

Hvilken handling, der iværksættes, bygger på en konkret og individuel vurdering af det enkelte projekt. I vurderingen vil bl.a. kunne indgå projektets størrelse, hidtidige projektforsløb, projektets stade mv.

**Projekter underlagt tættere opfølgning**

Ministeriet for Sundhed og forebyggelse fører tættere opfølgning på Region Midtjyllands projekt Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) og Region Syddanmarks projekt Aabenraa Sygehus.

DNU har været underlagt tættere opfølgning siden december 2011. Opfølgningen har primært knyttet sig til konsolidering af projektets omfang, hvor en løbende opdrift i arealet i projektet aktuelt har betydet en arealtilvækst på ca. 64.000 m<sup>2</sup> fra 187.000 m<sup>2</sup> til ca. 251.000 m<sup>2</sup>. Væksten afspejler forholdet mellem det beregnende udgangspunkt for totalrammen, og det areal regionen nu planlægger at etablere inden for totalrammen. Det bemærkes, at areal ikke er en selvstændig tilsagnsbetingelse, men at opdrift i areal kan indebære et pres på totalrammen. Ligeledes har ministeriets opfølgning knyttet sig til styring af projektet, herunder risiko og reserver. Dette gælder specielt for det første store underprojekt, hvor det aktuelle forventede reserveforbrug er skønnet til ca. 100 mio. kr. mod forudsat 20 mio. kr.

Regionens egen 3. øje rådgiver har i foråret 2014 gennemgået projektet. Gennemgangen viste en række usikkerheder i projektet, hvorfor der blev vurderet behov for yderligere granskning. Derudover blev det på baggrund af forårets gennemgang aftalt, at projektet indtil det første store underprojekt er realiseret skal have en større reservebuffer end hidtil forudsat med henblik på at skabe større sikkerhed for, at der er tilstrækkelige reserver til hele byggeperioden.

3. øje rådgiveren har i september/oktober gennemgået projektet på ny. På baggrund af gennemgangen er Region Midtjylland ved at igangsætte tiltag til at håndtere rådgiverens bemærkninger.




Region Syddanmarks projekt Aabenraa Sygehus har i projektets første fase – der bl.a. omfatter en ny akutmodtagelse - haft et større forbrug end oprindeligt budgetteret. Projektet finansierer de økonomiske overskridelser via projektets anden fase, hvor der aktuelt er ved at blive udarbejdet dispositionsforslag. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har modtaget særlig rapportering på reserveforbruget. Forbruget har her svaret til det korrigerede budget. Det bemærkes at fase 1 er taget i brug, men at regnskabet endnu ikke er afsluttet.

### Ibrugtagningstidspunkt

Det forventede ibrugtagningstidspunkt har forskubbet sig siden projekternes endelige tilsagn, jf. figur 1. Otte af projekterne forventes fortsat at være færdige på det tidspunkt, som fremgik af ansøgningen om endeligt tilsagn. Herudover er der to projekter, hvor ibrugtagningstidspunktet er fremrykket, mens ibrugtagningstidspunktet for seks projekter er forsinket. Det bemærkes, at ibrugtagningstidspunktet ikke er en tilsagnsbetingelse for det enkelte projekt.

Figur 1: Forventet ibrugtagningstidspunkt ved henholdsvis endeligt tilsagn, udbetalingsanmodning samt regionens nuværende vurdering.

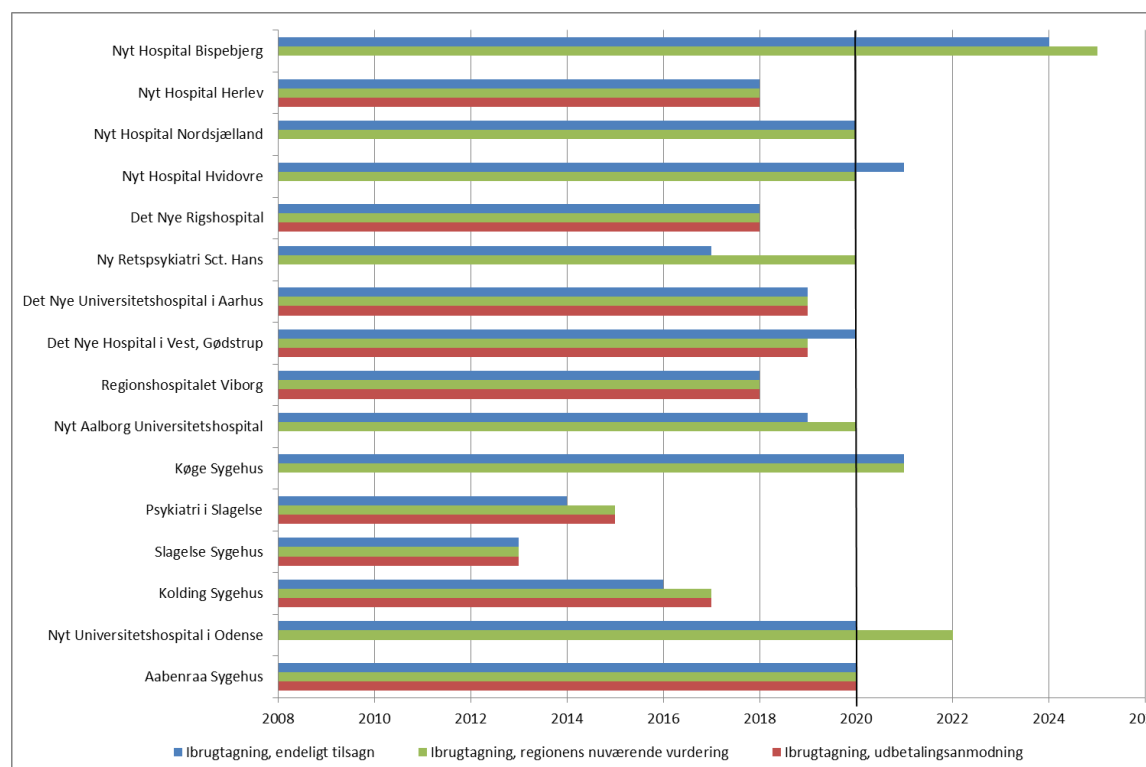

Anm.: Regionerne har ikke ansøgt om udbetaling af kvalitetsfondsmidler til alle projekter, hvorfor forventningen ikke fremgår i figur 1.

Kilde: Regionernes indmeldinger ved ansøgning om endeligt tilsagn samt løbende rapportering fra regionerne.

### Rigsrevisionen om sygehusbyggerier

Rigsrevisionen har lavet to beretninger til statsrevisorerne vedrørende sygehusbyggerier.

Rigsrevisionen har i *Beretning om sygehusbyggerier* fra december 2011 vurderet, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har tilrettelagt tilsynet med sygehusbyggerierne tilfredsstillende. I et opfølgende notat har Rigsrevisionen vurderet, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tiltag til at konkretisere tilsynet er tilfredsstillende. I februar 2014 har Rigsrevisionen valgt at afslutte beretningen, fordi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har taget initiativ til at sikre, at regionerne lever op til betingelserne for tilsagn. Rigsrevisionen finder ministeriets initiativer tilfredsstillende.

Rigsrevisionen har i *Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier II* fra oktober 2013 vurderet, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse på et tidligere tidspunkt end i maj 2013 burde have udarbejdet et koncept, som konkretiserer, hvordan ministeriet vil følge op, og som tydeliggør rammerne for at opføre effektiviseringerne.

For regionernes vedkommende finder Rigsrevisionen det ikke tilfredsstillende, at det er ugenomsigtigt, hvordan regionerne mere konkret vil realisere effektiviseringerne.

Rigsrevisionen finder det dog positivt, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har præciseret rammerne og dermed fastlagt et klarere udgangspunkt for opgørelsen af effektiviseringerne. Ligeledes finder Rigsrevisionen det positivt, at der for hvert enkelt projekt er opstillet et konkret mål om effektivisering.

På baggrund af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses ministersvar har Rigsrevisionen konkluderet, at de fortsat vil følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om, hvorvidt ministeriets evaluering af regelgrundlaget tilvejebringer den nødvendige gennemsigtighed til at følge regionernes effektiviseringer samt følge regionernes arbejde med at effektivisere sygehusdriften i de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier. Ministeriet har udarbejdet evaluering af konceptet, som tilgår Rigsrevisionen til orientering inden årets udgang.

## Læsevejledning til projektbeskrivelser

I den efterfølgende beskrivelse af de 16 kvalitetsfundsprojekter gælder, at:

- Alle beløb er opgjort i 09-PL. *Totalrammen* og *rammen til it, udstyr, apparatur mv.* er opgjort via det regionale anlægs-pl, mens *effektiviseringskravet* er opgjort via pl-indekset for sundhed ekskl. medicin.
- Kapacitetstal og arealer er opgjort på baggrund af ansøgningsmateriale til endeligt tilsagn eller rapportering til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Skæringsdatoen er 1. oktober 2014.
- Færdiggørelsesgraden er beregnet som et vægtet gennemsnit på baggrund af regionernes egen fremdriftsrapportering i kvartalsrapporteringen. Færdiggørelsesgraden er kun opgjort for de projekter, som har indsendt kvartalsrapporter til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
- Region Sjællands kvalitetsfundsprojekter fordeler sig tidsmæssigt og størrelsesmæssigt på en måde, så der ud fra principperne for finansieringsprofilerne ikke udbetales kvalitetsfundsmidler til Slagelse Sygehus, idet Region Sjælland bruger sin deponering hertil. Region Sjælland vil til gengæld modtage en større andel fra kvalitetsfonden til Universitetssygehus Køge og Slagelse psykiatri. Samlet vil finansieringen til Region Sjællands kvalitetsfundsprojekter være 59,8 pct. ekskl. energilån.
- Effektiviseringskravet til projekterne er en del af regeringens endelige tilsagn, der baserer sig på indstillinger fra ekspertpanelet.
- For de projekter, hvor der bygges til eksisterende bygninger, inkluderer kapacitetstal for den fremtidige drift også de eksisterende bygninger. Dog er eventuelle psykiatriske funktioner ikke medtaget.

## Nyt Hospital Bispebjerg

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, ud- styr, apparatur mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
2.950	509	0/1.764	-

### Beskrivelse af projektet

På Bispebjerg Hospitals matrikel skal der frem til 2025 nybygges et somatisk hospital, der skal rumme det fusionerede Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Dertil udføres omfattende ombygninger af de eksisterende bygninger på Bispebjerg matriklen.

Sideløbende med det kvalitetsfundsstøttede projekt, opfører Region Hovedstaden, for egne midler, et psykiatrisk hospital på Bispebjerg matriklen.

Herudover opføres en fælles laboratorie -og logistikbygning samt fælles P-hus og overflade parkering for matriklen.

### Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilsyn

Region Hovedstaden fik endeligt tilsagn fra regeringen til Nyt Hospital Bispebjerg den 21. februar 2014. Region Hovedstaden forventer at ansøge om udbetaling af kvalitetsfondsmidler til projektet i 2015.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører tilsyn ved faseovergange, indtil udbetaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes.

### Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

#### Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadrat- meter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
88.700/63.900	211.560	2015-2025

#### Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante Behandlinger	Antal sengedage
141	597.200	204.200

## Nyt Hospital Herlev

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, ud- styr, apparatur mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
2.250	250	0/1.345	-

### Beskrivelse af projektet

Kvalitetsfondsprojektet på Hospital Herlev består af to nye bygninger, som skal bygges syd for det nuværende hospital samt en udbygning af eksisterende servicebygning og kapel. Nybyggeriet skal bl.a. indeholde en fælles akutmodtagelse, et kvinde-barn-center og parkering.

### Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilsyn

Region Hovedstaden fik endeligt tilsagn fra regeringen til Herlev Hospital den 24. maj 2012. Region Hovedstadens ansøgning om udbetaling af kvalitetsfondsmidler er i proces.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører tilsyn ved faseovergange, indtil udbetaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes.

### Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

#### Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadrat- meter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
66.900/-	241.800	2018

#### Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante Behandlinger	Antal sengedage
109	517.500	255.956

## Nyt Hospital Nordsjælland

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, ud- styr, apparatur mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
3.800	735	0/2.272	-

### Beskrivelse af projektet

Region Hovedstaden har sammenlagt de tre hospitaler i Nordsjælland (Helsingør, Frederikssund og Hillerød) på et nybygget hospital ved Hillerød. Nyt Hospital Nordsjælland er det eneste såkaldte barmarksprojekt i Region Hovedstaden, og hospitalet vil blandt andet rumme fælles akutmodtagelse, kvinde- barn funktioner samt funktionerne kirurgi, ortopædkirurgi, intern medicin, neurologi, onkologi og palliativ behandling i forhold til både akutte og elektive patienter.

### Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilsyn

Region Hovedstaden fik endeligt tilsagn fra regeringen til Nyt Hospital Nordsjælland den 18. juni 2013. Region Hovedstaden forventer at ansøge om udbetaling af kvalitetsfondsmidler til projektet i efteråret 2017.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører tilsyn ved faseovergange, indtil udbetaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes.

### Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

#### Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadrat- meter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
124.000/-	124.000	2020

#### Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante Behandlinger	Antal sengedage
152	564.800	219.300

## Nyt Hospital Hvidovre

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, ud- styr, apparatur mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
1.450	150	0/867	-

### Beskrivelse af projektet

Projektet omfatter både ny- og ombygning. Med nybyggeriet samles kirurgiske modtagesenge, børnemodtagelse, skadegang og medicinsk akutmodtagelse i en fælles akutmodtagelse. Ligeledes indeholder nybyggeriet en pædiatrisk, obstetrisk samt kardiologisk afdeling og lægevagt. Derudover indeholder projektet en ombygning af ambulatorier og sengestuer.

### Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilsyn

Region Hovedstaden fik endeligt tilsagn fra regeringen til Hvidovre Hospital den 15. april 2013. Region Hovedstaden forventer at ansøge om udbetaling af kvalitetsfondsmidler til projektet i 2015.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører tilsyn ved faseovergange, indtil udbetaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes.

### Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

#### Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadrat- meter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
30.600/24.400	230.200	2020

#### Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante behandlinger	Antal sengedage
73	560.300	212.100

## Det Nye Rigshospital

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, ud- styr, apparatur mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
1.855	295	38,2/1.106	7

### Beskrivelse af projektet

Byggeriet på Rigshospitalet omfatter Nordfløjsbyggeriet, hvor hovedortocentrets senge, operationsstuer, støttefunktioner, dele af centerets kontorer samt ambulatoriefunktioner for hovedortocentret placeres. Endvidere opføres et byggeri, der skal huse et patienthotel med 75 senge og Rigshospitalets administration. Endelig opføres et parkeringshus med 665 pladser med mulighed for udvidelse til i alt 1000 pladser.

### Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilsyn

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 31. marts 2014 godkendt Region Hovedstadens udbetalingsanmodning til Det Nye Rigshospital.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører ordinært kvartalsvist og årligt tilsyn med projektet.

### Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

#### Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadrat- meter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
81.200/-	264.800	2018

#### Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante behandlinger	Antal sengedage
65	765.600	339.400



## Ny Retspsykiatri Sct. Hans

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, ud- styr, apparatur mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
550	45	0/329	-

### Beskrivelse af projektet

Region Hovedstadens Psykiatri varetager al psykiatrisk behandling i Region Hovedstaden og er en del af Københavns Universitetshospital. Psykiatrien er ét hospital med 11 psykiatriske centre geografisk spredt i hele Region Hovedstaden. De psykiatriske centre varetager behandlingen inden for de to lægefaglige specialer psykiatri (over 18 år) og børne- og ungdomspsykiatri (under 18 år).

Kvalitetsfundsprojektet Ny Retspsykiatri Sct. Hans samler centrets funktioner på den østlige matrikel, der omfatter nybyggeri med 126 sengepladser og tilgodeser regionens fremtidige behov for lukkede retspsykiatriske sengepladser.

### Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilsyn

Region Hovedstaden fik endeligt tilsagn fra regeringen til Ny Retspsykiatri Sct. Hans den 18. september 2012. Region Hovedstaden forventer at ansøge om udbetaling af kvalitetsfondsmidler til projektet i 3. kvartal 2015.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører tilsyn ved faseovergange, indtil udbetaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes.

### Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

#### Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadrat- meter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
25.000/-	97.700	2020

#### Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante behandlinger	Antal sengedage
18	-	-

## Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU)

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, ud- styr, apparatur mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
6.451	901	1.780/3.796	37 %

### Beskrivelse af projektet

Kvalitetsfondsprojektet DNU har til formål at samle alle somatiske specialer i Aarhus fra fire til én matrikel. Derudover skal det være det faglige omdrejningspunkt i regionen og levere højt specialiseret hospitalsbehandling til borgere i regionen og resten af landet.

Der bliver bygget et nyt akutcenter, et onkologisk center, et hoved-neuro center samt et abdominal-inflammatorisk center. Herudover bliver det eksisterende Aarhus Universitetshospital i Skejby renoveret sideløbende inden for Region Midtjyllands almindelige anlægsramme.

### Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilsyn

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 10. april 2012 godkendt Region Midtjyllands udbetalingsanmodning til Det Nye Universitetshospital i Aarhus.

Den 22. december 2011 fremsendte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i samarbejde med Finansministeriet en præcisering af forudsætningerne for tilsagnet for DNU projektet. Som en del af præciseringen fører Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse tættere opfølgning med projektet. Den tættere opfølgning omfatter kvartalsvis rapportering samt møder mellem Region Midtjylland og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

### Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

#### Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadrat- meter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
251.600/-	380.500	2016-2019

#### Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante behandlinger	Antal sengedage
445	832.100	242.800

## Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup (DNV)

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, ud- styr, apparatur mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
3.222	600	415/1.883	4 %

### Beskrivelse af projektet

Det nye hospital i Gødstrup indeholder en fuldt udbygget akutfunktion med tilhørende specialer. I forbindelse med det somatiske hospital opfører Region Midtjylland for egne midler et psykiatrisk hospital på 16.900 m<sup>2</sup>.

Det nye hospital i Gødstrup er en sammenlægning af hospitalerne i Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm. En del af sammenlægningen er allerede påbegyndt, hvorfor der på nuværende tidspunkt kun er hospitalsdrift på matriklerne i Herning, Holstebro og Lemvig. Matriklen i Ringkøbing er blevet til sundhedshus, mens matriklen i Tarm er blevet til sundhedscenter. Matriklen i Lemvig bliver til akuthus med både regionale og kommunale funktioner.

### Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilsyn

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 30. juni 2014 godkendt Region Midtjyllands udbetalingsanmodning til Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører ordinært kvartalsvist og årligt tilsyn med projektet.

### Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

#### Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadrat- meter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
142.900/-	142.900	2017-2019

#### Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante behandlinger	Antal sengedage
154	327.300	147.200

## Regionshospitalet Viborg

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, ud- styr, apparatur mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
1.164	115	332/688	30 %

### Beskrivelse af projektet

Kvalitetsfondsprojektet i Viborg består af en ny fælles akutmodtagelse samt om- og udbygning af Vestdansk Center for Rygmarvsskade. Samtidig bliver store dele af det eksisterende hospital ombygget og renoveret. Desuden bygges der et p-hus, og der sker en flytning af Patologisk Institut fra Skive til Viborg.

Regionshospitalet Viborg er en del af Hospitalsenhed Midt, der foruden Viborg inkluderer hospitalerne i Skive, Silkeborg og Hammel.

### Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilsyn

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 29. juni 2012 godkendt Region Midtjyllands udbetalingsanmodning til Regionshospitalet Viborg.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører ordinært kvartalsvist og årligt tilsyn med projektet.

### Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

#### Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadrat- meter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
32.400/38.200	116.900	2014-2018

#### Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante behandlinger	Antal sengedage
90	235.900	123.500

## Nyt Aalborg Universitetshospital

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, ud- styr, apparatur mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
4.100	796	0/2.451	-

### Beskrivelse af projektet

Det nye universitetshospital i Aalborg vil indeholde en fælles akutmodtagelse, sengefunktion, ambulatorier, laboratorier, børne- og ungefunktion, billedagnostiske funktioner, operationsfunktion, intensiv, integration af universitetsfaciliteter i hospitalet, rehabiliteringsfunktion, forsknings- og undervisningsarealer samt serviceby.

På det nye universitetshospital samles funktionerne fra hospitalerne Aalborg Sygehus Nord og Aalborg Sygehus Syd. På Aalborg Sygehus Syd vedbliver de nyeste bygninger dog med at fungere som en del af Aalborgs nye universitetshospital – herunder Medicinerhuset og Onkologibygningen tillige med tekniske installationer mf. Fl.. Bygningerne vil primært blive benyttet til ambulante funktioner for de medicinske specialer samt onkologi.

Nyt Aalborg Universitetshospital bliver Region Nordjyllands højt specialiserede hospital samt akuthospital.

### Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilsyn

Region Nordjylland fik endeligt tilsagn fra regeringen til Nyt Aalborg Universitetshospital den 15. marts 2012. Region Nordjylland forventer at ansøge om udbetaling af kvalitetsfondsmidler til projektet i 1. kvartal 2015.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører tilsyn ved faseovergange, indtil udbetaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes.

### Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

#### Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadrat- meter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
155.400/-	155.400	2020

#### Den fremtidige drift\*

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante Behandlinger	Antal sengedage
167	433.900	189.500

\*Aktiviteten omfatter matriklerne Øst og Syd, men ikke hospitalets øvrige matrikler (Dronninglund, Farsø og Hobro).

## Universitetssygehus Køge

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, ud- styr, apparatur mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
4.000	740	0/2.585	-

### Beskrivelse af projektet

Universitetssygehus Køge skal være hovedsygehuset i Region Sjælland og en af regionens fire akutsygehuse. På det nybyggede universitetssygehus samles alle regionens specialiserede funktioner. Sygehuset vil være akutsygehus med en fuldt udstyret akutmodtagelse og vil varetage såvel elektive som akutte opgaver i sine specialer.

### Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilsyn

Region Sjælland fik endeligt tilsagn fra regeringen til Køge Sygehus den 19. marts 2014. Region Sjælland forventer at ansøge om udbetaling af kvalitetsfondsmidler til projektet i 2015.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører tilsyn ved faseovergange, indtil udbetaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes.

### Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

#### Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadrat- meter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
130.100/4.600	176.400	2018-2021

#### Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante Behandlinger	Antal sengedage
183	421.000	244.600

## Psykiatri i Slagelse

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, ud- styr, apparatur mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
1.110	100	367/614	55 %

### Beskrivelse af projektet

Ved psykiatrien i Slagelse samles de nuværende mindre psykiatriske hospitalsenheder i Nykøbing Sjælland, Holbæk, Dianalund og Slagelse i én enhed. Herudover overflyttes den retspsykiatriske afdeling (sikringsafdelingen) fra Nykøbing Sjælland til Slagelse.

### Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilsyn

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 28. marts 2014. godkendt Region Sjællands udbetalingsanmodning til Psykiatri i Slagelse.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører ordinært kvartalsvist og årligt tilsyn med projektet.

### Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

#### Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadrat- meter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
44.000/-	44.000	2015

#### Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante behandlinger	Antal sengedage
12	13.000	62.400

## Slagelse Sygehus (somatik)

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, ud- styr, apparatur mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
300	0	0/0	99 %

### Beskrivelse af projektet

Til det eksisterende Slagelse Sygehus tilbygges en ny fælles akutmodtagelse, som gør det muligt for sygehuset at varetage områdets akutfunktion. Der etableres hjer-teafsnit og intensivafsnit i den nye akutfunktion, for at optimere arbejds gange i forhold til tungere akutpatienter.

### Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilsyn

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 28. juni 2013 godkendt Region Sjællands udbetalingsanmodning til Slagelse Sygehus (somatik).

Projektet er som det første kvalitetsfundsprojekt ibrugtaget. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse afventer anlægsregnskabet for projektet.

### Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

#### Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadrat- meter (inkl. eksisterende)	Ibrugtaget
15.500/-	80.600	2013

#### Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante Behandlinger	Antal sengedage
0	32.800*	21.700*

\*Kun opgjort for nybyggeriet.



## Kolding Sygehus

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, ud- styr, apparatur mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
912	100	131/538	24 %

### Beskrivelse af projektet

Om- og udbygningsprojektet på Kolding Sygehus vedrører opførslen af en fælles akutmodtagelse, et mor/barn center, en ny ankomstbygning, en ny sengebygning samt ombygning af dele af det eksisterende sygehus til ambulatorier og dialyse.

Kolding Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt, som også består af Vejle Sygehus, Middelfart Sygehus, Give Sygehus samt Fredericia Sygehus. Ved beregning af effektiviseringsgevinst for Kolding Sygehus er driftsudgifter i Fredericia forudsat at bortfalde. Funktionerne fra Fredericia Sygehus forventes at blive flyttet til Kolding i 2016.

### Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilsyn

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 28. juni 2013 godkendt Region Syddanmarks udbetalingsanmodning til Kolding Sygehus.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører ordinært kvartalsvist og årligt tilsyn med projektet.

### Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

#### Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadrat- meter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
33.600/28.000	121.600	2012-2017

#### Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante Behandlinger	Antal sengedage
74	260.200	111.200

## Nyt Universitetshospital i Odense (OUH)

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, ud- styr, apparatur mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
6.300	1.200	0/3.766	-

### Beskrivelse af projektet

Nyt Universitetshospital i Odense skal være det faglige omdrejningspunkt for Region Syddanmark og levere den højt specialiserede behandling. På hospitalet vil de nuværende kliniske afdelinger blive bundet op på ti kliniske kompetenceklynger samt tre tværgående kliniske afdelinger. Nyt Universitetshospital i Odense skal indeholde funktionerne for det nuværende Odense Universitetshospital.

Region Syddanmark opfører sideløbende med kvalitetsfondsprojektet et psykiatrisk hospital på matriklen. Derudover sammenbygges hospitalet med det sundhedsvidenskabelige fakultet ved Syddansk Universitet, som opføres samtidigt.

### Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilsyn

Region Syddanmark fik endeligt tilsagn fra regeringen til Nyt Universitetshospital i Odense den 15. juni 2011. Region Syddanmark forventer at ansøge om udbetaling af kvalitetsfondsmidler til projektet i 2015.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører tilsyn ved faseovergange, indtil udbetaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes.

### Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

#### Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadrat- meter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
212.000/-	212.000	2022

#### Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante behandlinger	Antal sengedage
340	655.300	202.100

## Aabenraa Sygehus

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, ud- styr, apparatur mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
1.264	200	236/747	37 %

### Beskrivelse af projektet

Om- og udbygningsprojektet i Aabenraa består af en fælles akutmodtagelse, et familiehus, modtagekøkken, sterilcentral, sengebygning inkl. ambulatorier, apotek, laboratorium, billeddiagnostik samt ombygning i en mindre del af det eksisterende sygehus.

Region Syddanmark opfører for egne midler sideløbende med kvalitetsfundsprojektet et psykiatrisk hospital på matriklen.

På Aabenraa Sygehus samles funktionerne for Haderslev Sygehus, der lukker i 2014, samt dele af Sønderborg Sygehus, som vil fortsætte som specialsygehus, når Aabenraa står færdigt.

### Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilsyn

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 29. oktober 2012 godkendt Region Syddanmarks udbetalingsanmodning til Aabenraa Sygehus.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører foruden ordinært kvartalsvist og årligt tilsyn med projektet også tættere opfølgning. Dette henset til et større reserverforbrug end budgetteret i projektets første fase.

### Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

#### Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadrat- meter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
38.800/17.100	71.000	2014-2020

#### Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante behandlinger	Antal sengedage
100	207.000	88.700
