



Sundheds- og Ældreministeriet

Enhed: Sundhedsøkonomi
Sagsbeh.: DEPMNH
Sagsnr.: 1506731
Dok. nr.: 1812864
Dato: 04. november 2015

**Status for kvalitetsfundsstøttede sygehusbyggerier
Årsrapportering til Folketingets Finansudvalg 2015**

Indhold

Indledning.....	3
Baggrund	3
Formelle rammer for projekterne, herunder ministeriets rolle	3
Status for projekterne og ministeriets arbejde	4
Projekter under skærpet tilsyn.....	5
Ibrugtagningstidspunkt	6
Rigsrevisionen om sygehusbyggerier	6
Koncept for evaluering af afsluttede kvalitetsfondsbyggerier	7
Justeret løsning for pl-regulering af delramme til it, udstyr og apparatur mv.	8
Sygehusbyggerierne i ØA15 og ØA16 – opfølgning og nye aftaler	8
Sygehusbyggerierne i FL16	8
Bilag.....	8
Læsevejledning til projektbeskrivelser	9
Region Hovedstaden	10
Nyt Hospital Bispebjerg	10
Nyt Hospital Herlev	11
Nyt Hospital Nordsjælland	12
Nyt Hospital Hvidovre	13
Det Nye Rigshospital	14
Ny Retspsykiatri Sct. Hans	15
Region Midtjylland	16
Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU).....	16
Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup (DNV)	17
Regionshospitalet Viborg	18
Region Nordjylland.....	19
Nyt Aalborg Universitetshospital	19
Region Sjælland.....	20
Universitetssygehus Køge	20
Psykiatri i Slagelse	21
Slagelse Sygehus (somatik).....	22
Region Syddanmark.....	23
Kolding Sygehus.....	23
Nyt Universitetshospital i Odense (OUH)	24
Aabenraa Sygehus	25

Indledning

SUM skal løbende orientere Sundheds- og Ældreudvalget (kvartalsvist) og Finansudvalget (årligt) om status på de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier, *jf. administrationsgrundlag vedr. Sundheds- og Ældreministeriets kvalitetsfondsmidler til sygehusinvesteringer.*

Status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier 2015 orienterer Folketingets Finansudvalg om omfang, status og udvikling i de regionale sygehusbyggerier, som modtager tilskud fra den statslige kvalitetsfond.

Baggrund

Det fremgår af økonomiaftalen med regionerne for 2008, at målsætningen om et tidssvarende og bæredygtigt sygehuvæsen kræver strukturændringer og investeringer i nye bygninger og ny teknologi. Den daværende regering nedsatte derfor i 2007 et ekspertpanel, der fik til opgave at vurdere konkrete anlægsprojekter fra regionerne i forhold til en række i økonomiaftalen fastlagte principper vedrørende samling af enheder, driftsøkonomisk rentabilitet, effektivitet og kvalitet.

Ekspertpanelet vurderede bl.a. ansøgningerne ud fra en forventning om, at der i 2020 ville være 20 pct. færre senge og 50 pct. flere ambulante behandlinger end i 2007. Der var ikke tale om et krav til regionerne, men om en beregningsforudsætning.

På baggrund af panelets anbefalinger blev den økonomiske ramme for projekterne lagt fast i finansloven for 2009. Der er en samlet totalramme på 41,4 mia. kr. (09-pl). Heraf bidrager staten via Kvalitetsfonden med 25 mia. kr. og regionerne med 16,4 mia. kr. Med økonomiaftalen for 2013 fik regionerne desuden mulighed for at låne op til 1 mia. kr. til energiinvesteringer i kvalitetsfondsprojekterne. Den samlede totalramme for projekterne er godt 45 mia. kr. i 15-pl.

Der er meddelt endeligt regeringstilsagn til de i alt 16 projekter. Her er både tale om helt nybyggede hospitaler og til- og ombygninger på eksisterende matrikler. Fælles for projekterne er, at de alle spiller en vigtig rolle i samlingen af specialer på færre matrikler.

I regeringens tilsagn til det enkelte projekt er der fastsat en totalramme, som er den maksimale udgift regionerne må bruge på at opføre et tidssvarende og fuldt funktionsdygtigt hospital. Det er desuden en tilsagnsbetingelse, at en bestemt andel af totalrammen reserveres til it, udstyr, apparatur mv.

Totalrammen er gældende i hele projektperioden, og der foretages ikke besparelser i totalrammen fra statens side. De ændringer, der eventuelt sker i projekterne, er prioriteringer og omdisponeringer foretaget af regionerne inden for det enkelte projekts totalramme. Den økonomiske totalramme sikrer, at der også er midler til øvrige regionale anlægsprojekter, som ikke er støttet af kvalitetsfonden, ligesom den fremmer omkostnings-effektive og innovative løsninger.

Formelle rammer for projekterne, herunder ministeriets rolle

Regelsættet for kvalitetsfondsprojekterne udgøres af et administrationsgrundlag samt en regnskabs- og en revisionsinstruks. Administrationsgrundlaget beskriver ministeriets overordnede retningslinjer samt ansvarsfordelingen mellem ministeriet og regionerne. Regnskabsinstruksen beskriver regionernes forpligtelser som tilskudsmodtager, herunder rammerne for regionernes rapportering til ministeriet.

Regionerne er bygherrer på de enkelte kvalitetsfondsbyggerier. Det er et tilsagnskrav, at regionerne skal levere fuldt funktionsdygtige sygehuse, som bygges fleksibelt, så de kan

håndtere fremtidens behandlingsbehov. Inden for investeringsrammen er det op til regionerne at vælge de løsninger, der er hensigtsmæssige lokalt.

Sundheds- og Ældreministeriet udbetaler tilskud fra Kvalitetsfonden og fører tilsyn med projekterne. Formålet med tilsynet er at sikre, at de enkelte projekter lever op til regeringens tilsagnsbetingelser, og at de er robuste og realisable inden for den økonomiske totalramme, der er bindende for det enkelte projekt. Tilsynet er baseret på regionernes rapporter om projekterne, der også tilgår regionsrådene.

Inden der kan udbetales tilskud, skal projekterne indsende en udbetalingsanmodning, der skal godkendes af ministeriet. Når udbetalingsanmodningen er godkendt, skal regionen hvert kvartal sende en rapport til ministeriet, som danner grundlag for udbetaling af tilskud.

Hvis Sundheds- og Ældreministeriet ikke er fuldt betrygget i, at et givent projekt er robust og realiserbart inden for tilsagnsbetingelserne, har ministeriet mulighed for at skærpe tilsynet. Det kan f.eks. indebære krav om hyppigere og mere detaljeret rapportering eller at udbetaling af kvalitetsfondsmidler sættes i bero.

Alle kvalitetsfundsprojekterne undtagen Slagelse Sygehus' akutmodtagelse har i det endelige tilsagn fået et nominelt effektiviseringskrav på mellem 4 og 8 procent af driftsbudgettet for de funktioner, der berøres af byggeriet. Effektiviseringskravet ligger ud over de almindelige årlige produktivetskrav og skal være realiseret senest et år efter projektets ibrugtagning. Effektiviseringsgevinsterne indgår som finansieringsbidrag til ny sygehusaktivitet i de årlige økonomiaftaler og kan dermed ikke indgå som en del af sygehusenes eksisterende drift. Ministeriet følger op på regionernes arbejde med effektiviseringer i projekterne.

Status for projekterne og ministeriets arbejde

. / . 11 projekter får eller har fået udbetalt midler fra Kvalitetsfonden. Her har 10 projekter anmodet om adgang til energilånepuljen til kvalitetsfundsbyggerier.

Kvalitetsfundsprojekterne Slagelse Sygehus (fælles akutmodtagelse) og Psykiatri i Slagelse (GAPS) er ibrugtaget, og de øvrige projekter er i forskellige faser, jf. *Tabel 1 og bilag 1*.

I 2015 har ministeriet godkendt udbetalingsanmodninger fra Nyt Hospital Herlev, Nyt Odense Universitetshospital og Nyt Aalborg Universitetshospital.

De resterende fem projekter har pr. ultimo 2015 endnu ikke anmodet om at få udbetalt midler fra Kvalitetsfonden.

Table 1: Status for quality fund projects pr. ultimo 2015

Projekt	Tilsagnsramme (mio. kr. 09-PL)	Korrigeret tilsagnsramme inkl. energilån (mio. Kr. 09-PL)	Ministeriets proces	Ministeriets tilsyn
Region Hovedstaden	12.850	12.895		
Nyt Hospital Bispebjerg	2.950	2.950	Endeligt tilsagn	Faserapportering
Nyt Hospital Herlev	2.250	2.290	Udbetaling	Kvartalsvis rapportering
Nyt Hospital Nordsjælland	3.800	3.800	Endeligt tilsagn	Faserapportering
Nyt Hospital Hvidovre	1.450	1.450	Endeligt tilsagn	Faserapportering
Det Nye Rigshospital	1.850	1.855	Udbetaling	Kvartalsvis rapportering
Ny Retspsykiatri Sct. Hans	550	550	Endeligt tilsagn	Faserapportering
Region Midtjylland	10.650	10.837		
Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU)	6.350	6.451	Udbetaling	Skærpet tilsyn
Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup (DNV)	3.150	3.222	Udbetaling	Kvartalsvis rapportering
Regionshospitalet Viborg	1.150	1.164	Udbetaling	Kvartalsvis rapportering
Region Nordjylland	4.100	4.100		
Nyt Aalborg Universitetshospital	4.100	4.191	Udbetaling	Kvartalsvis rapportering
Region Sjælland	5.350	5.410		
Køge Sygehus	4.000	4.000	Endeligt tilsagn	Faserapportering
Psykiatri i Slagelse	1.050	1.110	Ibrugtaget	Skærpet tilsyn. Afventer endeligt anlægsregnskab
Slagelse Sygehus (somatik)	300	300	Ibrugtaget	Afventer endeligt anlægsregnskab
Region Syddanmark	8.450	8.621		
Kolding Sygehus	900	912	Udbetaling	Kvartalsvis rapportering
Nyt Universitetshospital i Odense (OUH)	6.300	6.444	Udbetaling	Kvartalsvis rapportering
Aabenraa Sygehus	1.250	1.264	Udbetaling	Kvartalsvis rapportering
I alt	41.400	41.954		

Anm.: Grundet projekternes størrelse kan der være vanskeligheder ved at angive projektets præcise placering, da forskellige underprojekter kan være i forskellige faser. I den korrigerede tilsagnsramme indgår for Psykiatri i Slagelse et beløb på 60 mio. kr. til sikringsmæssige installationer, som regeringen i endeligt tilsagn har accepteret at Region Sjælland afholder af den almindelige anlægsramme.

Kilde: SUM's møder med regionerne samt tilgængeligt materiale på hjemmesider mv.

Projekter under skærpet tilsyn

Psykiatri i Slagelse (GAPS)

Det nye psykiatrihospital i Slagelse blev indviet d. 24. august 2015, og byggeriet er nu fuldt ibrugtaget. Byggesagen er ikke afsluttet, så byggeregnskab er endnu ikke opgjort. Dertil bemærkes at verserende voldgiftssager vil påvirke det endelige resultat. Regionen forventer at voldgiftssagerne kan afsluttes med et mindre overskud for projektet, men denne vurdering er behæftet med en vis usikkerhed.


Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU)

DNU har været underlagt skærpet tilsyn siden december 2011. Siden endeligt tilsagn er arealet øget med 64.000 m², svarende til 34 pct. Ministeriets opfølgning har især knyttet sig til afgrænsning af DNU ift. areal og funktioner samt styringen af projektet, herunder risiko og reserver. Ministeriet vurderer, at der fortsat er behov for skærpet tilsyn, bl.a. henset til, at 2016 vil være endnu et intenst byggeår på DNU.

Ibrugtagningstidspunkt

Det forventede ibrugtagningstidspunkt er for en række af projekterne justeret siden regeringens endelige tilsagn, jf. figur 1. Seks af projekterne forventes at være færdige i det år, som fremgik af ansøgningen om endeligt tilsagn. For to projekter er ibrugtagningsår fremrykket, mens ibrugtagningsår for otte projekter er udskudt. Ibrugtagningstidspunkt er ikke et tilsagnsvilkår, men ministeriet følger overordnet op på, at den nye sygehusstruktur realiseres ca. 2020.

Figur 1: Forventet ibrugtagningsår for de 16 byggerier ved hhv. endeligt tilsagn, udbetalingsanmodning og pr. ultimo 2015

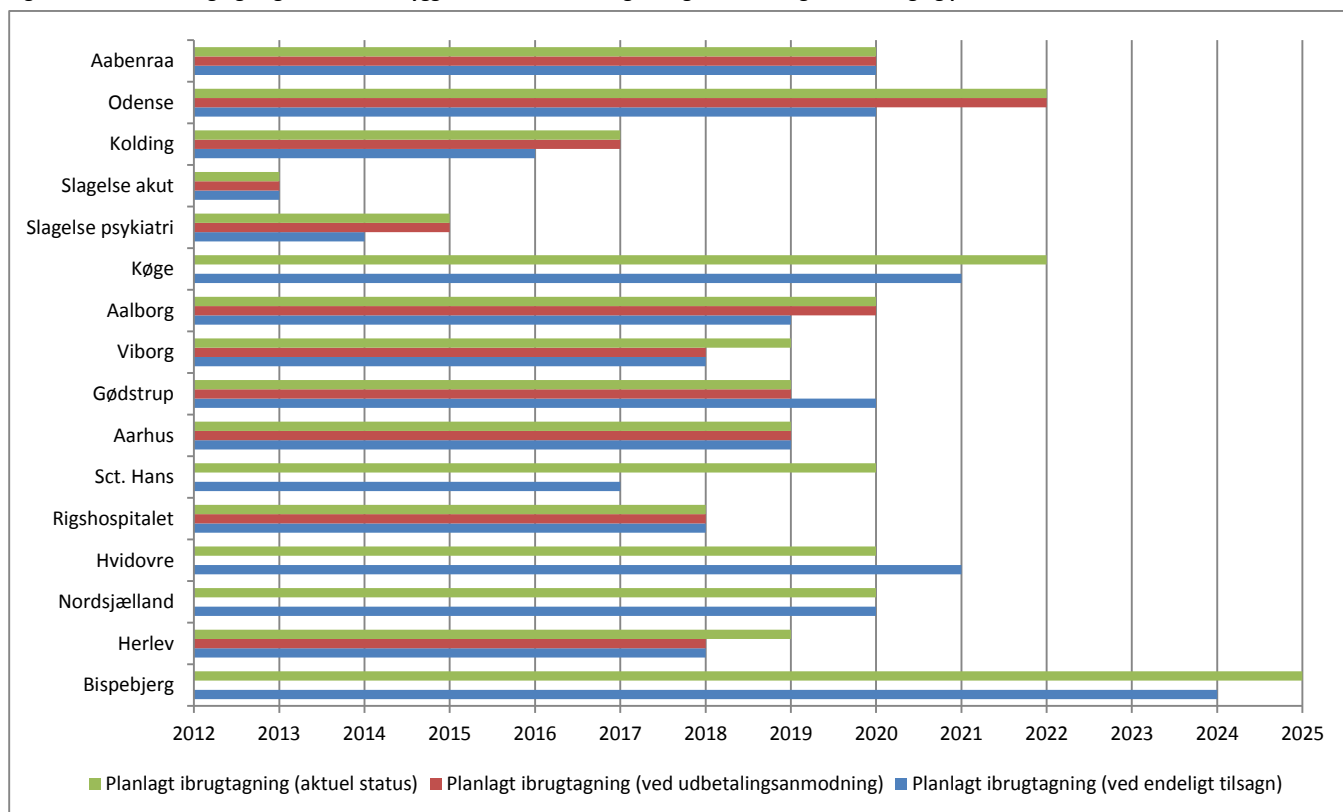

Anm.: Regionerne har endnu ikke ansøgt om udbetaling af kvalitetsfondsmidler til alle projekter. Figuren viser forventet ibrugtagning af det samlede sygehus. I en række af projekterne vil dele af sygehuset blive ibrugtaget tidligere end angivet ovenfor.

Kilde: Regionernes ansøgninger om endeligt tilsagn, udbetalingsanmodninger og løbende rapporteringer til SUM.

Rigsrevisionen om sygehusbyggerier

Rigsrevisionen har tidligere udarbejdet to beretninger om kvalitetsfundsprojekterne (Beretning om sygehusbyggerier I og II) og har netop åbnet en ny forundersøgelse af de kvalitetsfundsstøttede sygehusbyggerier.

Beretning om sygehusbyggerier (ministeriets tilsagnsproces og tilrettelæggelse af tilsynet)

Rigsrevisionen vurderede i *Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier* fra december 2011, at ministeriet ikke havde gennemført en tilfredsstillende tilsagnsproces, men at ministeriet havde tilrettelagt tilsynet med sygehusbyggerierne tilfredsstillende.

I et opfølgende notat vurderede Rigsrevisionen, at ministeriets tiltag til at konkretisere tilsynet var tilfredsstillende. I februar 2014 afsluttede Rigsrevisionen sin beretning med henvisning til, at ministeriet havde taget initiativ til at sikre, at regionerne lever op til betingelserne for tilsagn. Rigsrevisionen fandt ministeriets initiativer tilfredsstillende.

Beretning om sygehusbyggerier II (effektiviseringer)

Rigsrevisionen vurderede i *Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier II* fra oktober 2013, at ministeriet på et tidligere tidspunkt end i maj 2013 burde have udarbejdet et koncept, som konkretiserede, hvordan ministeriet ville følge op, og som tydeliggjorde rammerne for at opgøre effektiviseringerne.

For regionernes vedkommende fandt Rigsrevisionen det ikke tilfredsstillende, at det var ugenomsigtigt, hvordan regionerne konkret ville realisere effektiviseringerne.

Rigsrevisionen fandt det dog positivt, at ministeriet havde præciseret rammerne og dermed fastlagt et klarere udgangspunkt for opgørelsen af effektiviseringerne. Ligeledes fandt Rigsrevisionen det positivt, at der for hvert enkelt projekt var opstillet et konkret mål om effektivisering.

På baggrund af det afgivne ministersvar konkluderede Rigsrevisionen, at den fortsat ville følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om, hvorvidt ministeriets evaluering af regelgrundlaget tilvejebringer den nødvendige gennemsigtighed til at følge regionernes effektiviseringer samt følge regionernes arbejde med at effektivisere sygehusdriften i de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier.

Som opfølgning på Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier II (oktober 2013) har SUM i efteråret 2014 evalueret konceptet for vurdering af regionernes arbejde med effektiviseringer i kvalitetsfondsprojekterne.

Ministeriets evaluering konkluderer, at konceptet fra maj 2013 lever op til hovedformålet om at skabe gennemsigtighed for regionens arbejde med at realisere de forudsatte effektiviseringskrav samt sandsynliggøre, at effektiviseringsgevinsten kan henføres til kvalitetsfondsinvesteringen og at gevinsten kan realiseres som forudsat i år et efter ibrugtagelsen. Ministeriet har ultimo 2014 fremsendt evalueringen til Rigsrevisionen til orientering.

Forundersøgelse af sygehusbyggerier efterår 2015 (effektiviseringer, risikostyring og byggeorganisationer)

Rigsrevisionen har i oktober 2015 åbnet en forundersøgelse af de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier. Formålet med undersøgelsen er at vurdere regionernes arbejde med at risikostyre byggerierne og opbygge kompetente byggeorganisationer. Rigsrevisionen vil samtidig følge op på dels regionernes arbejde med at effektivisere sygehusdriften i de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier, dels Sundheds- og Ældreministeriets evaluering af, om den opdaterede regnskabsinstruks og administrationsgrundlaget tilvejebringer den nødvendige gennemsigtighed omkring regionernes effektiviseringer, jf. notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II af 21. februar 2014.

Koncept for evaluering af afsluttede kvalitetsfondsbyggerier

Det fremgår af administrationsgrundlaget for de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier, at der ved ibrugtagning af de enkelte projekter skal udarbejdes en evalueringsrapport, som beskriver projektets resultater i forhold til at skabe muligheder for effektiviseringer samt bedre kapacitetsudnyttelse og bedre patientforløb mv. Evalueringen skal omfatte opfølgning på projektspecifikke mål, som regionerne har opstillet for det enkelte projekt og som kan henføres til den kvalitetsfondsstøttede investering.

Ud over de individuelle evalueringer skal Sundheds- og Ældreministeriet i takt med realiseringen af projekterne foretage en samlet vurdering af, hvordan projekterne samlet set bidrager til at udvikle den nye sygehusstruktur.

Sundheds- og Ældreministeriet har i samarbejde med Danske Regioner fastsat et koncept for evaluering af de enkelte kvalitetsfundsbyggerier. Slagelse Sygehus har som det første projekt udarbejdet en evaluering, der er fremsendt til SUM ultimo marts 2015.

Justeret løsning for pl-regulering af delramme til it, udstyr og apparatur mv.

Sundheds- og Ældreministeriet har besluttet at revidere pl-fremskrivningen af delrammen til it, udstyr og apparatur mv. i kvalitetsfundsprojekterne. Den reviderede model giver mulighed for inden for det enkelte projekts totalramme at allokere relativt flere midler til byggeri og færre til it, udstyr og apparatur mv.

Baggrunden for beslutningen er, at forskellen i prisudvikling på hhv. byggeri og apparatur i 2009-2014 har skabt en overskydende købekraft på delrammen til apparatur og dermed forskudt den balance mellem byggeri og apparatur, der var tilsigtet fra ekspertpanelets side.

Ministeriet har derfor foretaget en justering af regnskabsinstruksen for 2015, så regionen kan undlade at pl-regulere delrammen for it mv. frem til og med 2014. Det nominelle krav til investeringer i it, udstyr og apparatur mv., der i regeringens endelige tilsagn er angivet i 09-pl, pl-reguleres dermed i stedet med 2014 som basisår.

Beslutningen er meddelt Danske Regioner i august 2015 og indgår i regnskabsinstruksen for kvalitetsfundsstøttede sygehusbyggerier for 2015.

Sygehusbyggerierne i ØA15 og ØA16 – opfølgning og nye aftaler

Regeringen og Danske Regioner aftalte med økonomiaftalen for 2015, at der med ekstern konsulentbistand skulle foretages en evaluering af byggestyringsprincipperne i kvalitetsfundsprojekterne. Rapporten skulle udarbejdes som led i regionernes arbejde med videndeling på byggerierne.

Den færdige rapport foreligger nu, og er offentliggjort af Danske Regioner på www.godtsygehusbyggeri.dk. Regeringen og Danske Regioner har med økonomiaftalen for 2016 aftalt, at Danske Regioner med afsæt i rapporten vil understøtte regionerne i at arbejde systematisk med styring af byggerierne.

Som led i udmøntning af ØA15 har Danske Regioner i december 2014 leveret en oversigt over videndeling ifm. kvalitetsfundsprojekterne. Regionerne har iværksat en række aktiviteter, men omfanget af forpligtende samarbejde er fortsat begrænset. SUM har derfor foreslået, at regionerne gennemfører flere strategisk relevante tiltag på tværs af kvalitetsfundsbyggerierne.

Det fremgår endvidere af økonomiaftalen for 2016, at regeringen og Danske Regioner er enige om fortsat at følge regionernes arbejde med videndeling tæt. Danske Regioner skal inden udgangen af 2015 opdatere oversigten over de initiativer, som regionerne har igangsat i projektet om videndeling.

Sygehusbyggerierne i FL16

Regeringen har i finansloven for 2016 forpligtet til at drøfte med Danske Regioner, hvordan der sikres fleksibel levering og den rette mad og ernæring til patienter på de nye sygehuse, som ikke har egne produktionskøkkener.

Bilag

- Faseoversigt for kvalitetsfundsprojekterne pr. ultimo 2015

Læsevejledning til projektbeskrivelser

I den efterfølgende beskrivelse af de 16 kvalitetsfondsprojekter gælder, at:

- Alle beløb er opgjort i 09-PL. *Totalrammen* og *rammen til it, udstyr, apparatur mv.* er opgjort via det regionale anlægs-pl, mens *effektiviseringskravet* er opgjort via pl-indekset for sundhed ekskl. medicin.
- Kapacitetstal og arealer er opgjort på baggrund af ansøgningsmateriale til endeligt tilsagn og rapportering til Sundheds- og Ældreministeriet. Skæringsdatoen er 1. oktober 2015.
- Færdiggørelsesgraden er beregnet som et vægtet gennemsnit på baggrund af regionernes egen fremdriftsrapportering i kvartalsrapporteringen. Færdiggørelsesgraden er kun opgjort for de projekter, som har indsendt kvartalsrapporter til Sundheds- og Ældreministeriet.
- Region Sjællands kvalitetsfondsprojekter fordeler sig tidsmæssigt og størrelsesmæssigt på en måde, så der ud fra principperne for finansieringsprofilerne ikke udbetales kvalitetsfondsmidler til Slagelse Sygehus, idet Region Sjælland bruger sin deponering hertil. Region Sjælland vil til gengæld modtage en større andel fra kvalitetsfonden til Universitetssygehus Køge og Slagelse psykiatri. Samlet vil finansieringen til Region Sjællands kvalitetsfondsprojekter være 59,8 pct. ekskl. energilån.
- Effektiviseringskravet til projekterne er en del af regeringens endelige tilsagn, der baserer sig på indstillinger fra ekspertpanelet.
- For de projekter, hvor der bygges til eksisterende bygninger, inkluderer kapacitetstal for den fremtidige drift også de eksisterende bygninger. Dog er eventuelle psykiatriske funktioner ikke medtaget.

Region Hovedstaden

Nyt Hospital Bispebjerg

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, udstyr, apparaturl mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
2.950	509	0/1.764	-

Beskrivelse af projektet

På Bispebjerg Hospitals matrikel skal der frem til 2025 nybygges et somatisk hospital, der skal rumme det fusionerede Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Dertil udføres omfattende ombygninger af de eksisterende bygninger på Bispebjerg matriklen.

Sideløbende med det kvalitetsfundsstøttede projekt, opfører Region Hovedstaden, for egne midler, et psykiatrisk hospital på Bispebjerg matriklen.

Herudover opføres en fælles laboratorie -og logistikbygning, samt fælles overflade parkering for matriklen. Et p-hus er udført og ibrugtaget den 19. november 2015.

Sundheds- og Ældreministeriets tilsyn

Region Hovedstaden fik endeligt tilsagn fra regeringen til Nyt Hospital Bispebjerg den 21. februar 2014. Region Hovedstaden forventer at ansøge om udbetaling af kvalitetsfondsmidler til projektet i 2016.

Sundheds- og Ældreministeriet fører tilsyn ved faseovergange, indtil udbetaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes.

Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadratmeter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
66.500/32.000	196.500	2015-2025

Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante Behandlinger	Antal sengedage
141	597.200	204.200

Nyt Hospital Herlev

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, udstyr, apparaturl mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
2.250	250	85/1.345	24 %

Beskrivelse af projektet

Kvalitetsfondsprojektet på Herlev Hospital omfatter en ny bygning, der skal bygges syd for det nuværende hospital. Nybyggeriet skal bl.a. indeholde en fælles akutmodtagelse samt et kvinde-barn-center. Der er desuden udført en udbygning af kapel samt etableret et spildevandsrensingsanlæg i et OPI samarbejde med kvalitetsfondsprojektet. Endvidere pågår arbejder med udbygning og ombygning af den eksisterende servicebygning. Beslutning om endelig udformning og placering af P-hus på matriklen er i proces.

Sundheds- og Ældreministeriets tilsyn

Sundheds- og Ældreministeriet har den 19. februar 2015 godkendt Region Hovedstadens udbetalingsanmodning til Nyt Hospital Herlev.

Sundheds- og Ældreministeriet fører ordinært kvartalsvist og årligt tilsyn med projektet.

Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadratme- ter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
63.500/13.000	241.800	2019

Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante Behandlinger	Antal sengedage
109	517.500	255.956

Nyt Hospital Nordsjælland

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, udstyr, apparatur mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
3.800	735	0/2.272	-

Beskrivelse af projektet

Region Hovedstaden har sammenlagt de tre hospitaler i Nordsjælland (Helsingør, Frederikssund og Hillerød) på et nybygget hospital ved Hillerød. Nyt Hospital Nordsjælland er det eneste såkaldte barmarksprojekt i Region Hovedstaden, og hospitalet vil blandt andet rumme fælles akutmodtagelse, kvinde- barn funktioner samt funktionerne kirurgi, ortopædkirurgi, intern medicin, neurologi, onkologi og palliativ behandling i forhold til både akutte og elektive patienter.

Sundheds- og Ældreministeriets tilsyn

Region Hovedstaden fik endeligt tilsagn fra regeringen til Nyt Hospital Nordsjælland den 18. juni 2013. Region Hovedstaden forventer at ansøge om udbetaling af kvalitetsfondsmidler til projektet i efteråret 2017.

Sundheds- og Ældreministeriet fører tilsyn ved faseovergange, indtil udbetaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes.

Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadratme- ter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
124.000/-	124.000	2020

Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante Behandlinger	Antal sengedage
152	564.800	219.300

Nyt Hospital Hvidovre

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, udstyr, apparatur mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
1.450	150	0/867	-

Beskrivelse af projektet

Projektet omfatter både ny- og ombygning. Med nybyggeriet samles kirurgiske modtagesenge, børnemodtagelse, skadegang og medicinsk akutmodtagelse i en fælles akutmodtagelse. Ligeledes indeholder nybyggeriet en pædiatrisk, obstetrisk samt kardiologisk afdeling og lægevagt. Derudover indeholder projektet en ombygning af ambulatorier og senge-
stuer.

Sundheds- og Ældreministeriets tilsyn

Region Hovedstaden fik endeligt tilsagn fra regeringen til Hvidovre Hospital den 15. april 2013. Region Hovedstaden forventer at ansøge om udbetaling af kvalitetsfondsmidler til projektet i 2016.

Sundheds- og Ældreministeriet fører tilsyn ved faseovergange, indtil udbetaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes.

Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadratme- ter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
30.600/24.400	230.200	2020

Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante behandlinger	Antal sengedage
73	560.300	212.100

Det Nye Rigshospital

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, udstyr, apparaturl mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
1.855	295	209/1.106	36 %

Beskrivelse af projektet

Byggeriet på Rigshospitalet omfatter Nordfløjsbyggeriet, hvor hovedortocentrets senge, operationsstuer, støttefunktioner, dele af centerets kontorer samt ambulatoriefunktioner for hovedortocentret placeres. Endvidere er et byggeri, der huser patienthotel med 75 senge og Rigshospitalets administration ibrugtaget den 21. august 2015. Endeligt er der også opført et p-hus med 665 pladser med mulighed for udvidelse til i alt 1000 pladser, der blev ibrugtaget den 15. juli 2015.

Sundheds- og Ældreministeriets tilsyn

Sundheds- og Ældreministeriet har den 31. marts 2014 godkendt Region Hovedstadens udbetalingsanmodning til Det Nye Rigshospital.

Sundheds- og Ældreministeriet fører ordinært kvartalsvist og årligt tilsyn med projektet.

Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadratme- ter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
62.700/-	246.300	2018

Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante behandlinger	Antal sengedage
65	765.600	339.400

Ny Retspsykiatri Sct. Hans

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, udstyr, apparaturl mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
550	16,5	0/329	-

Beskrivelse af projektet

Region Hovedstadens Psykiatri varetager al psykiatrisk behandling i Region Hovedstaden og er en del af Københavns Universitetshospital. Psykiatrien er ét hospital med 11 psykiatriske centre, hvoraf 10 geografisk spredt er beliggende i Region Hovedstaden, mens Psykiatrisk center Sct. Hans er placeret ved Roskilde.

Kvalitetsfundsprojektet Ny Retspsykiatri Sct. Hans samler centrets funktioner på den østlige matrikel, der omfatter nybyggeri med 126 sengepladser og tilgodeser regionens fremtidige behov for lukkede retspsykiatriske sengepladser.

Sundheds- og Ældreministeriets tilsyn

Region Hovedstaden fik endeligt tilsagn fra regeringen til Ny Retspsykiatri Sct. Hans den 18. september 2012. Region Hovedstaden forventer at ansøge om udbetaling af kvalitetsfondsmidler til projektet i primo 2017.

Sundheds- og Ældreministeriet fører tilsyn ved faseovergange, indtil udbetaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes.

Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadratmeter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
21.000/-	93.700	2020

Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante behandlinger	Antal sengedage
18	-	-

Region Midtjylland

Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU)

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, udstyr, apparatur mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
6.451	901	2.428/3.796	70 %

Beskrivelse af projektet

Kvalitetsfondsprojektet DNU har til formål at samle alle somatiske specialer i Aarhus fra fire til én matrikel. Derudover skal det være det faglige omdrejningspunkt i regionen og levere højt specialiseret hospitalsbehandling til borgere i regionen og resten af landet.

Der bliver bygget et nyt akutcenter, et onkologisk center, et hoved-neuro center samt et abdominal-inflammatorisk center. Herudover bliver det eksisterende Aarhus Universitetshospital i Skejby renoveret sideløbende inden for Region Midtjyllands almindelige anlægsramme.

Sundheds- og Ældreministeriets tilsyn

Sundheds- og Ældreministeriet har den 10. april 2012 godkendt Region Midtjyllands udbetalingsanmodning til Det Nye Universitetshospital i Aarhus.

Den 22. december 2011 fremsendte Sundheds- og Ældreministeriet i samarbejde med Finansministeriet en præcisering af forudsætningerne for tilsagnet for DNU projektet. Som en del af præciseringen fører Sundheds- og Ældreministeriet skærpet tilsyn med projektet. Den tættere opfølgning omfatter kvartalsvis rapportering samt møder mellem Region Midtjylland og Sundheds- og Ældreministeriet.

Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadratme- ter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
250.953/-	410.953	2017-2019

Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante behandlinger	Antal sengedage
445	832.100	242.800

Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup (DNV)

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, udstyr, apparaturl mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
3.222	600	413/1.883	16 %

Beskrivelse af projektet

Det nye hospital i Gødstrup indeholder en fuldt udbygget akutfunktion med tilhørende specialer. I forbindelse med det somatiske hospital opfører Region Midtjylland for egne midler et psykiatrisk hospital på 12.800 m².

Det nye hospital i Gødstrup er en sammenlægning af hospitalerne i Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm. En del af sammenlægningen er allerede påbegyndt, hvorfor der på nuværende tidspunkt kun er hospitalsdrift på matriklerne i Herning, Holstebro og Lemvig. Matriklen i Ringkøbing er blevet til sundhedshus, mens matriklen i Tarm er blevet til sundhedscenter. Matriklen i Lemvig bliver til akuthus med både regionale og kommunale funktioner.

Sundheds- og Ældreministeriets tilsyn

Sundheds- og Ældreministeriet har den 30. juni 2014 godkendt Region Midtjyllands udbetalingsansøgning til Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup.

Sundheds- og Ældreministeriet fører ordinært kvartalsvist og årligt tilsyn med projektet.

Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadratmeter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
127.375/-	127.375	2019

Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante behandlinger	Antal sengedage
154	360.000	137.000

Regionshospitalet Viborg

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, udstyr, apparaturl mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
1.164	115	372/688	37 %

Beskrivelse af projektet

Kvalitetsfondsprojektet i Viborg består af en ny fælles akutmodtagelse samt om- og udbygning af Vestdansk Center for Rygmarvsskade. Samtidig bliver store dele af det eksisterende hospital ombygget og renoveret. Desuden bygges der et p-hus, og der sker en flytning af Patologisk Institut fra Skive til Viborg.

Regionshospitalet Viborg er en del af Hospitalsenhed Midt, der foruden Viborg inkluderer hospitalerne i Skive, Silkeborg og Hammel.

Sundheds- og Ældreministeriets tilsyn

Sundheds- og Ældreministeriet har den 29. juni 2012 godkendt Region Midtjyllands udbetalingsanmodning til Regionshospitalet Viborg.

Sundheds- og Ældreministeriet fører ordinært kvartalsvist og årligt tilsyn med projektet.

Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadratmeter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
32.400/31.200	116.900	2014-2019

Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante behandlinger	Antal sengedage
90	235.900	123.500

Region Nordjylland

Nyt Aalborg Universitetshospital

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, udstyr, apparaturl mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
4.191	796	0/2.451	-

Beskrivelse af projektet

Nyt Aalborg Universitetshospital vil indeholde en fælles akutmodtagelse, sengefunktion, ambulatorier, laboratorier, børne- og ungefunktion, billediagnostiske funktioner, operationsfunktion, intensiv, integration af universitetsfaciliteter i hospitalet, rehabiliteringsfunktion, forsknings- og undervisningsarealer samt serviceby.

På det nye universitetshospital samles funktionerne fra hospitalerne Aalborg Sygehus Nord og Aalborg Sygehus Syd. På Aalborg Sygehus Syd vedbliver de nyeste bygninger dog med at fungere som en del af Aalborgs nye universitetshospital – herunder Medicinerhuset og Onkologibygningen tillige med tekniske installationer mfl. Bygningerne vil primært blive benyttet til ambulante funktioner for de medicinske specialer samt onkologi.

Nyt Aalborg Universitetshospital bliver Region Nordjyllands højt specialiserede hospital samt akuthospital.

Sundheds- og Ældreministeriets tilsyn

Sundheds- og Ældreministeriet har 18. december 2015 godkendt Region Midtjyllands udbetalingsanmodning for Nyt Aalborg Universitetshospital.

Sundheds- og Ældreministeriet fører ordinært kvartalsvist og årligt tilsyn med projektet.

Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadratmeter (inkl. eksisterende)*	Forventet ibrugtagning
162.300/-	162.300	2020

Den fremtidige drift**

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante Behandlinger	Antal sengedage
167	433.900	189.500

* Arealet omfatter alene Øst-matriklen.

**Aktiviteten omfatter matriklerne Øst og Syd, men ikke hospitalets øvrige matrikler (Dronninglund, Farsø og Hobro).

Region Sjælland

Universitetssygehus Køge

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, udstyr, apparaturl mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
4.000	740	0/2.585	-

Beskrivelse af projektet

Universitetssygehus Køge skal være hovedsygehuset i Region Sjælland og en af regionens fire akutsygehuse. På det nybyggede universitetssygehus samles alle regionens specialiserede funktioner. Sygehuset vil være akutsygehus med en fuldt udstyret akutmodtagelse og vil varetage såvel elektive som akutte opgaver i sine specialer.

Sundheds- og Ældreministeriets tilsyn

Region Sjælland fik endeligt tilsagn fra regeringen til Køge Sygehus den 19. marts 2014. Region Sjælland forventer at ansøge om udbetaling af kvalitetsfondsmidler til projektet i 2016.

Sundheds- og Ældreministeriet fører tilsyn ved faseovergange, indtil udbetaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes.

Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadratme- ter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
140.000/4.500	185.000	2019-2022

Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante Behandlinger	Antal sengedage
183	459.000	256.000

Psykiatri i Slagelse

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, udstyr, apparaturl mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
1.110	100	551/614	99 %

Beskrivelse af projektet

Ved psykiatrien i Slagelse samles de nuværende mindre psykiatriske hospitalsenheder i Nykøbing Sjælland, Holbæk, Dianalund og Slagelse i én enhed. Herudover overflyttes den retspsykiatriske afdeling (sikringsafdelingen) fra Nykøbing Sjælland til Slagelse.

Sundheds- og Ældreministeriets tilsyn

Sundheds- og Ældreministeriet har 28. marts 2014 godkendt Region Sjællands udbetalingsanmodning til Psykiatri i Slagelse.

Projektet ibrugtages i oktober / november 2015 og kun færdiggørelse af den omkringliggende park udestår. Sundheds- og Ældreministeriet afventer anlægsregnskabet og fører desuden skærpet tilsyn med projektet.

Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadratmeter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
44.000/-	44.000	2015

Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante behandlinger	Antal sengedage
12	13.000	62.400

Slagelse Sygehus (somatik)

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, udstyr, apparatur mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
300	0	0/0	100 %

Beskrivelse af projektet

Til det eksisterende Slagelse Sygehus tilbygges en ny fælles akutmodtagelse, som gør det muligt for sygehuset at varetage områdets akutfunktion. Der etableres hjerteafsnit og intensivafsnit i den nye akutfunktion, for at optimere arbejdsgange i forhold til tungere akutpatienter.

Sundheds- og Ældreministeriets tilsyn

Sundheds- og Ældreministeriet har den 28. juni 2013 godkendt Region Sjællands udbetalingsanmodning til Slagelse Sygehus (somatik).

Projektet er ibrugtaget. Sundheds- og Ældreministeriet afventer anlægsregnskabet for projektet.

Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadratmeter (inkl. eksisterende)	Ibrugtaget
16.509	81.600	2013

Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante Behandlinger	Antal sengedage
0	32.800*	21.700*

*Kun opgjort for nybyggeriet.

Region Syddanmark

Kolding Sygehus

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, udstyr, apparaturl mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
912	100	245/538	66 %

Beskrivelse af projektet

Om- og udbygningsprojektet på Kolding Sygehus vedrører opførslen af en fælles akutmodtagelse, et mor/barn center, en ny ankomstbygning, en ny sengebygning samt ombygning af dele af det eksisterende sygehus til ambulatorier og dialyse.

Kolding Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt, som også består af Vejle Sygehus, Middelfart Sygehus, Give Sygehus samt Fredericia Sygehus. Ved beregning af effektiviseringsgevinst for Kolding Sygehus er driftsudgifter i Fredericia forudsat at bortfalde. Funktionerne fra Fredericia Sygehus forventes at blive flyttet til Kolding i 2016.

Sundheds- og Ældreministeriets tilsyn

Sundheds- og Ældreministeriet har den 28. juni 2013 godkendt Region Syddanmarks udbetalingsanmodning til Kolding Sygehus.

Sundheds- og Ældreministeriet fører ordinært kvartalsvist og årligt tilsyn med projektet.

Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadratmeter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
33.600/28.000	121.600	2012-2017

Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante Behandlinger	Antal sengedage
74	260.200	111.200

Nyt Universitetshospital i Odense (OUH)

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, udstyr, apparaturl mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
6.444	1.200	0/3.766	8 %

Beskrivelse af projektet

Nyt Universitetshospital i Odense skal være det faglige omdrejningspunkt for Region Syddanmark og levere den højt specialiserede behandling. På hospitalet vil de nuværende kliniske afdelinger blive bundet op på ti kliniske kompetenceklynger samt tre tværgående kliniske afdelinger.

Region Syddanmark opfører sideløbende med kvalitetsfondsprojektet et psykiatrisk hospital på matriklen, hvoraf voksenpsykiatrien bliver etableret som OPP-projekt. Derudover sammenbygges hospitalet med det sundhedsvidenskabelige fakultet ved Syddansk Universitet, som opføres samtidigt.

Sundheds- og Ældreministeriets tilsyn

Sundheds- og Ældreministeriet har 10. august 2015 godkendt Region Syddanmarks udbetalingsanmodning vedr. OUH.

Sundheds- og Ældreministeriet fører ordinært kvartalsvist og årligt tilsyn med projektet.

Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadratmeter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
224.176/-	224.176	2022

Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante behandlinger	Antal sengedage
340	655.300	202.100

Aabenraa Sygehus

Totalramme (mio. kr. 09-PL)	Ramme til it, udstyr, apparatur mv. (mio. kr. 09-PL)	Udbetalte kvalitets- fondsmidler af kvali- tetsfondens andel (mio. kr. 09-PL)	Færdiggørelsesgrad
1.264	200	259/747	46 %

Beskrivelse af projektet

Om- og udbygningsprojektet i Aabenraa består af en fælles akutmodtagelse, et familiehus, modtagekøkken, sterilcentral, sengebygning inkl. ambulatorier, laboratorium, billeddiagnostik samt ombygning i en mindre del af det eksisterende sygehus.

Region Syddanmark har for egne midler sideløbende med kvalitetsfondsprojektet opført et psykiatrisk hospital på matriklen.

På Aabenraa Sygehus samles funktionerne for Haderslev Sygehus, der lukkede i 2014, samt dele af Sønderborg Sygehus, som vil fortsætte som specialsygehus, når Aabenraa står færdigt.

Sundheds- og Ældreministeriets tilsyn

Sundheds- og Ældreministeriet har den 29. oktober 2012 godkendt Region Syddanmarks udbetalingsanmodning til Aabenraa Sygehus.

Sundheds- og Ældreministeriet fører ordinært kvartalsvist og årligt tilsyn med projektet.

Nøgletal for projektet og den fremtidige drift

Projektet

Antal kvadratmeter (nybyg/ombyg)	Nyt samlet antal kvadratme- ter (inkl. eksisterende)	Forventet ibrugtagning
41.059/10.440	73.229	2014-2021

Den fremtidige drift

Effektiviseringskrav (mio. kr. 09-PL)	Antal ambulante behandlinger	Antal sengedage
100	207.000	88.700
