

Ottekantet Pavillon

Projekt i Kølby



Indhold

- 1. Fra ide til virkelighed**
- 2. Byggefase**
- 3. Referat fra møder**
- 4. Indvielse**
- 5. Fotos**
- 6. Avisomtale**
- 7. Regnskab**
- 8. Evaluering**

1.

I løbet 2000 begyndte ideen med et fælles samlingssted i Lergraven at tage form i Borgerfor-ningens bestyrelse. På mange mødeaftner blev der drøftet størrelse, placering, udformning, materialer og m.a. Alle var dog enige om at det kunne være rart at have et sted hvor arrangementer kunne afholdes, men også til brug for dagplejebørnene, turisterne, kort sagt som opholdssted for brugere af Lergraven. Forslag til udseende og anvendelse blev drøftet på bestyrelsesmøderne. Der blev endog arrangeret en tur til Halkær skov hvor der allerede fandtes en lignende pavillon. Foreningen fik forslag fra forskellige studerende fra Teknisk Skole, og i 2005 blev Erik Holbech, Farstrup hyret til at udføre tegninger og beregninger til en pavillon. En byggetilladelse blev søgt og bevilget af Nibe Kommune. Nu gik drøftelserne på hvordan penge til et sådan byggeri kunne skaffes.

Da vi så blev en del af Aalborg Kommune i 2007 blev vi opmærksomme på at her var der mulighed for at søge midler. I første omgang sendte vi ansøgning til Aalborg Kommunes (AKA) puljer for lokale Projekter. Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling (SBU) kontaktede os da de mente vi havde et godt projekt og de opfordrede os efter et møde til at søge midler fra Aalborg Kommunes Fyrtårnspulje. Denne ansøgning blev sendt i november 2007 og stor var vores glæde da vi fik bevilget Kr. 370.000,- fra denne pulje.

Nu kunne byggeriet starte og første spadestik blev foretaget af Råmand Thomas Kastrup-Larsen den 16. februar 2008.

SGB blev bestilt til udgravning og støbearbejde, og NA-Byg skulle så for tømrerarbejde og taglægning. Arbejdet med gulv- og vægbeklædning skulle udføres ved hjælp af frivillige.



2.





I løbet af forår og sommer 2008 tog Pavillonen form. Fra sit hjem oven for Lergraven har Bjarne fulgt byggeriet:

Pavillonbyggeri Lergraven

16-02-2008	Første spadestik blev taget af Thomas Kastrup Larsen. Borgerforening byder på pølser,øl,vand og kaffe
22-02-2008	Opstart - overjord fjernes, og der fyldes sand på og opstampes
27-02-2008	sokkelrør for midterstolpe støbt fast
29-02-2008	sokkelrør for hjørnestolper støbt fast
06-03-2008	stolper og spær (rundtræ) + åse leveret
06-03-2008	galvaniserede samlebeslag + topplade leveret
06-03-2008	Bestyrelse er ikke tilfreds med leveret rundtræ. Tømrer indvilliger i at bytte de værste.
15-03-2008	Tømrer håber på at få rejst rundtræ inden påske men kan ikke køre med liftgrej pga.at jorden er for blød
18-03-2008 ?	Der leveres nye rundtræ i stedet for de kaserede
22-03-2008	Jens Lund og Bjarne afbarker rundtræ på hjørnestolper
26-03-2008	Anton - Jens Lund - Gunnar og Bjarne afbarker rundtræ (remme)
27-03-2008	Anton - Gunnar og Jens Lund afbarker rundtræ (spær)
28-03-2008	Tømrer opsætter skurvogn
30-03-2008	Bjarne færdigopsætter byggestrøm og tilslutter spænding
31-03-2008	Tømrer opsætter hjørne og midterstolper og monterer jernbeslag
01-04-2008	Tømrer opsætter remme
02-04-2008	Tømrer klargør spær kan ikke nå montering i top, lejer en lift
03-04-2008	Tømrer opsætter de 2 første spær
04-04-2008	Tømrer opsætter spær nr.3 og 4
05-04-2008	Tømrer opsætter spær 5,6 og 7
08-04-2008	Tømrer opsætter sidste spær og udborer huller for rundjern
09-04-2008	Tømrer opsætter nederste ås op
10-04-2008	Tømrer har opsat åser på 1,5 tagside
11-04-2008	Tømrer har opsat åser på 4 tagsider
14-04-2008	Tømrer har opsat åser på 5 tagsider
15-04-2008	Tømrer har opsat åser på 6 tagsider
16-04-2008	Tømrer har opsat alle åser på taget
17-04-2008	Tømrer påbegynder oplægning af tagbeklædning (krydsfiner)
22-04-2008	Tømrer beklæder tagside 2 og 3
23-04-2008	Tømrer beklæder tagside 3 og 4
24-04-2008	Tømrer har beklædt tagside 4 og 5. Tagdækker påbegynder påsvejsning af underpap

4-04-2008 Byggemøde
5-04-2008 Tømrer beklæder tagside 6 og 7. Tagdækker er 1/3 færdig med påsvejsning af underpap
8-04-2008 Tømrer er færdig med tagbeklædning og tagdækker er halvt færdig med påsvejsning af underpap
9-04-2008 Tømrer begynder nedfræsning af rendejern i tagbeklædning
0-04-2008 Tømrer påsætter taghætte. Tagdækker er færdig med påsvejsning af underpap
5-05-2008 VVS installatør påmonterer tagrender
8-05-2008 Tømrer isætter 4 stk. vinduer i tag
1-06-2008 Lars henter rundtømmer til gulvkant i Struer på traktor med vogn
2-06-2008 Bjarne bestiller gulvbrædder og strøer hos Lx Byg Løgstør
7-06-2008 Generalforsamling: Bestyrelse beviliges oprettelse af kassekredit til bugetoverskridelser
7-06-2008 Jens Lund og Bjarne afbarker rundtræ til gulvkanter
7-06-2008 Jens Lund, Jørgen og Bjarne påbegynder tilpasning af rundtømmer til gulvkanter
2-06-2008 LX Byg har ikke leveret strøer og gulvbrædder som aftalt, Bjarne rykker for levering
4-06-2008 Jens Lund og Bjarne udskærer rundtømmer til kanter om gulv
5-06-2008 Jens Lund og Bjarne udskærer rundtømmer til kanter om gulv
3-06-2008 LX Byg leverer strøer og gulvbrædder
3-06-2008 Bjarne udskærer rundtømmer til kanter om gulv
1-06-2008 Tagdækker er godt halv færdig med sidste lag tagpap
1-06-2008 Bjarne udskærer rundtømmer til kanter om gulv
1-06-2008 Jens Lund, Lars og Jørgen forbereder fundamenter til gulvstrøer (fliser og mursten)
-06-2008 Bjarne udskærer rundtømmer til kanter om gulv
-06-2008 Jens Lund, Holk, Lars og Jørgen forbereder fundamenter til gulvstrøer (fliser og mursten)
-06-2008 Dorte, Birgit og Bodil leverer rundstykker kaffe og kage
-06-2008 Jørgen tilskærer gulvstrøer
-06-2008 Jørgen tilskærer første præt langs rundtømmer fag 1
-06-2008 Jørgen og Bjarne ligger gulvbrædder i fag 1
-06-2008 Else Marie serverer kaffe og nybagt kage
-06-2008 Jørgen og Bjarne ligger gulvbrædder i fag 1
-06-2008 Jørgen og Bjarne ligger gulvbrædder i fag 2, Per leverer fliser til fundament
-07-2008 Lars og Per laver fundament til gulvstrøer fag 4
-07-2008 Lis serverer kaffe og nybagt kage
-07-2008 Bjarne sværter strøer ved indgangsåbninger
-07-2008 Lars laver fundament til gulvstrøer fag 4
-07-2008 Jørgen og Bjarne ligger gulvstrøer i fag 3, Jens Lund laver fundament til gulvstrøer
-07-2008 Jørgen og Bjarne ligger gulvstrøer i fag 3 og 4
-07-2008 Jørgen og Bjarne ligger gulv i fag 3

05-07-2008 Lars og Jens laver fundament til gulvstrøer fag 5 6 7
05-07-2008 Dorte udskærer tagpapstykker til mellemlæg mellem fundament og strøer
05-07-2008 Ingelise serverer kaffe og ostemadder
06-07-2008 Jørgen og Bjarne ligger gulv i fag 4
08-07-2008 På bestyrelsesmøde vedtages at sidebeklædning bliver opretstående da kalmarbrædder ikke kan leveres
08-07-2008 Bjarne overdrager regning til Rikke fra XL Byg til betaling
11-07-2008 Bjarne ligger strøer i fag 5
12-07-2008 Bjarne og Jan ligger gulv i fag 5
12-07-2008 Karen leverer kaffe og kage
18-07-2008 Bjarne ligger gulvstrøer i fag 6
18-07-2008 Bjarne tilskærer yderste gulvbrædt i fag 6
19-07-2008 Anders Chr. Og Bjarne ligger gulv i fag 6
19-07-2008 Bodil leverer kaffe og kage
21-07-2008 Jens Lund ligger gulvstrøer i fag 7
24-07-2008 Bjarne tilskærer yderste gulvbrædt i fag 7
02-08-2008 Bjarne og Kasper ligger gulv i fag 7
02-08-2008 Kikki leverer sodavand og kage
03-08-2008 Bjarne ligger strøer i fag 8
05-08-2008 Lars indkalder bestyrelse og frivillige hjælpere til møde. Færdiggørelse og indvielse 23-8
05-08-2008 Bjarne, Jens Lund og Holk ligger gulv i fag 8
05-08-2008 Per, Jørgen, Jesper, Jan, Poul, Gunnar og Per Nielsen påbegynder sidebeklædninger
05-08-2008 Lars tilrettelægger byggeri og indvielse
05-08-2008 Dorte, Birgit, Else Marie, Eva H, og Karen tilrettelægger indvielse og legedag
05-08-2008 Else Ravnborg leverer kage til kaffen
06-08-2008 Bjarne tilskærer gulvbrædder langs ydervægge fag 8
07-08-2008 Anton, Per, Jens Lund, Lars og Jesper laver sidebeklædning og udhæng fag 1-2
07-08-2008 Bjarne og Gunnar tilskærer beklædning ved sidestolper fag 1-2
07-08-2008 Dorte leverer kaffe
08-08-2008 Bjarne og Gunnar tilskærer sidebeklædning ved stolper fag 3-4
08-08-2008 Per laver udhæng fag 2-3
08-08-2008 Anne og Else Marie laverudkast til oplysningstavler
08-08-2008 Eva leverer kaffe og boller
09-08-2008 Jens lund og Gunnar beklæder sider fag 4-5
09-08-2008 Bjarne laver dør og tilskærer sidebeklædning ved stolper fag 5
09-08-2008 Lars og Birgit laver udhæng fag 3-4
09-08-2008 Birgit og Bodil leverer kaffe boller og kage

10-08-2008 Lars forhører sig om køb af presenninger fra det gamle telt i Farstrup
12-08-2008 Jens Lund og Anton nedlægger trappetrin ved indgange af natursten
13-08-2008 SBG og Per nedgraver faskiner og laver nedløb
15-08-2008 Lars og Bjarne laver udhæng
15-08-2008 Bjarne sætter rigler op omkring dør og monterer håndtag i dør
16-08-2008 Jens Lund og Anton ligger stenkopper langs sokkel og planerer
16-08-2008 Bjarne graver ud under nederste rundtømmer til ventilation under gulv
16-08-2008 Else Marie henter virer til ophængning af presenninger
16-08-2008 Gunnar sætter de sidste midterrigler op og sømmer beklædning fast
16-08-2008 Bjarne og Lars laver udhæng
16-08-2008 Per og Lis ryder op i pavillon
16-08-2008 Bjarne monterer wire for pressing
18-08-2008 Lars og Bjarne laver udhæng
19-08-2008 Bjarne laver udhæng fag 7-8
19-08-2008 Jens Lund, Per og Mads monterer pressing og bæringer for wire
20-08-2008 Lars laver det sidste udhæng
21-08-2008 Jens Lund, Anton og Per reparerer legeplads
21-08-2008 Bjarne drejer håndtag til trapez legeplads
22-08-2008 Forberedelser til indvielse ? (alle)
23-08-2008 Indvielse

3.

Referater fra møder afholdt i forbindelse med Pavillon projektet.

Den 08.01.08. Hos Bjarne

Til stede var: Jens Lund Holm, Per Svenstrup, Rikke Holst, Bettina Bentsen, Lars Andersen, Bjarne Sørensen og Else Marie Justesen.

Accept for tilskud blev underskrevet.

Der blev drøftet bankforbindelse.

Per kontakter Sparekassen Himmerland.

Per informerer håndværkere.

Vi forventer opstart i Feb/Marts.

Ved salg af medlemskort for Borgerforeningen skal frivillig arbejdskraft findes.

Per og Rikke indhenter tilbud fra forsikringsselskaber.

Forskellige detaljer som byggestrøm og –vand blev drøftet.

Første spadestik forsøges foretaget af formand for SBU.

Else Marie kontakter Avis.

Den 28.01.08. Hos Rikke

Til stede var: Jens Lund Holm, Per Svenstrup, Rikke Holst, Bettina Bentsen, Lars Andersen, Bjarne Sørensen og Else Marie Justesen.

Første spadestik foretages 9. el. 10. feb eller 16. el. 17 feb. Lars kontakter rådmand.

Else Marie kontakter Nibe Avis og sætter sedler op ved busskuret og i frysehuset.

Der serveres pølser, øl og vand ved arrangementet. Else Marie, Rikke og Bettina køber ind.

Bjarne sørger for øl og vand.

Håndværkere starter støbning midt i feb. og NA-Byg starter ca. 01.03.08.

Sparekassen Himmerland opretter byggekredit, rente 6,95%. Birgit Skov Villadsen ønsker kopi af referat.

Forsikring tegnes hos Himmerland. Forsikring under opførelse Kr. 870,-. Personforsikring ca. Kr.

1980,- for 416 timer. Forsikring for færdig bygning Kr. 1383,-/årligt.

Byggestrøm og –vand kan leveres af Jørgen P.

Den 08.04.08. Hos Jens Lund

Til stede var: Jens Lund Holm, Per Svenstrup, Rikke Holst, Lars Andersen og Else Marie Justesen.

Økonomi og forsikring blev drøftet. Penge fra Fyrtårnsprojekt er overført til banken.

Det blev vedtaget at indhente priser på ovenlysvinduer hos NA-Byg. Per spørger.

Materialevalg til vægge og gulv blev drøftet. Bjarne og Per har indhentet priser, de går videre med det tilbudte.

Det blev vedtaget at afholde Rejsegilde, med pølser, øl og vand, når undertag er lagt. Der annonceres ikke i avis, men hænges meddelelser op ved busskuret og i frysehusets vindue.

Den 20.05.08. Hos Else Marie

Til stede var: Jens Lund Holm, Per Svenstrup, Rikke Holst, Lars Andersen og Else Marie Justesen.

Det blev besluttet at få monteret 4 stk. ovenlysvinduer. Pris fra NA-Byg Kr. 10,000,- + moms.
Lars rykker for træbeklædning til vægge.

Lars og Jens tager til møde med Sparekassen Himmerland om oprettelse af kassekredit den 22.05.
Lokal historie til plancher blev drøftet.

Den 16.06.08. Hos Lars

Til stede var: Jens Lund Holm, Per Svenstrup, Rikke Holst, Lars Andersen, Bjarne Sørensen og Else Marie Justesen.

Presseninger til pavillon blev drøftet – vi starter med enkel og billig løsning.
Gulvbeklædning blev aftalt – fastgørelse blev drøftet – forslag til frivillig arbejdskraft.
NA-Byg skal have a'conto beløb på Kr. 100.000,- Lars kontakter dem.

Den 08.07.08. Hos Per

Til stede var: Jens Lund Holm, Per Svenstrup, Rikke Holst, Lars Andersen, Bjarne Sørensen og Else Marie Justesen.

Arbejds stede blev gennemgået. Gulv er halv færdig.
Leverandør har problemer med at lave vægbeklædning til vandret pga. længden. Det besluttes derfor at ændre til lodret. 5 sider af pavillonen lukkes, og der laves en dør på bagsiden.
Restbeløb til NA-Byg betales efter levering af nedløbsrør.
Else Marie skriver liste med tlf. nr. på frivillige medhjælpere.
Der efterlyses ideer til indvielsesfesten den 23.08.08.

Foruden disse møder holdtes der jævnligt byggemøder på pladsen ved pavillonen, hvor forskellige detaljer og problemer blev drøftet og løst.

4.

Lørdag den 23.08.2008 oprandt så den store dag hvor Indvielsen af Pavillonen skulle foregå.

Forinden var der hektisk aktivitet med færdiggørelse af byggeriet og med at planlægge selve dagen.

Planlægningen af Legedagen og Aftenfesten blev fordelt på to udvalg, og alle gik til opgaverne med frisk mod. Der blev ryddet op og fejret, opstillet borde og stole. Else og Gunnar Ravnborg påtog sig at stå for blomsterdekorationer til bordene, og der blev bagt kager til eftermiddagskaffen rundt om i hjemmene. Den første plan blev færdig og anbragt på væggen i Pavillonen. Trods tidspres og træthed blev vi færdige til tiden og kunne byde velkommen i det flotte byggeri.

Arrangementet startede kl. 13.00 i strålende solskin. Formanden for Kølby og omegns Borgerforening Lars Andersen bød velkommen til de ca. 50 fremmødte voksne og børn, og gav ordet til Anna Kirsten Olesen fra Aalborg Kommune. Hun holdt tale om det vigtige i et godt sammenhold blandt borgerne i de små samfund og hun roste meget det flotte resultat der er kommet ud af det og den flotte hjemmeside byen har (www.koelbylandsby.dk).

Selve indvielsen foretog Anna Kirsten Olesen ved med et koben at trække et søm ud af en planke.

Herefter tog formanden for Farstrup Borgerforening Morten Bøjer ordet og gratulerede på festlig vis Kølby med den nye Pavillon og overrakte samtidig en plade til indgravering af navn. Også Arne Segerstrøm fra Sparekassen Himmerland ønskede til lykke og havde en check med på Kr. 20.000,-

Fra Sparekassen Himmerlands Gavefond. Farstrup Boldklub overrakte et smukt glasfad som gave til Kølby og omegns Borgerforening.

Som lovet fik alle nu lov til at grave navne i Pavillonens midterstolpe til minde om dagen og det arbejde der er blevet lagt.

Næste punkt i programmet var landsbydyst med bl.a. trillebørstafet, støvlekast, skilpaddeløb, opgaver med klodser og vand samt tovtrækning. Kølby's hold vandt med et enkelt point over Farstrup, og begge hold fik overrakt flotte pokaler. Herefter blev der traditionen tro spillet rundbold.

Alle havde en sjov eftermiddag og kunne bagefter nyde forfriskninger i pavillonen. Dagen sluttede med en hyggelig aftenfest med grilsteget gris og underholdning af The Ålerusers.



5.












Kølby fejrede ny pavillon med indvielse og dyst!

Den forløbne weekend kunne borgerne i Kølby og nærmeste omegn glæde sig over, at den nyopførte fælles-pavillon i Lergraven blev indviet, og fremover kan være centrum for nye tiltag.

SIDE 10

01

art klar med ny pavillon

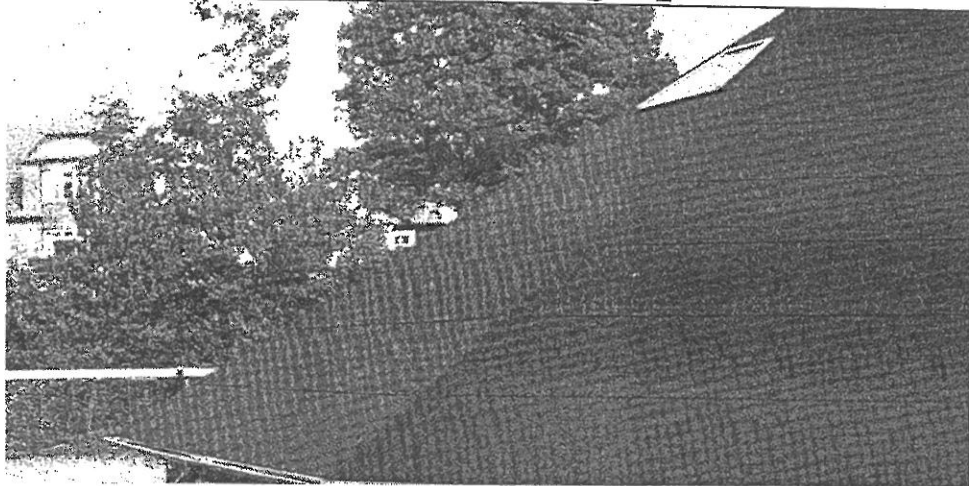

Kølbynitterne klar til pavillonfest

KØLBY: Så er der snart dømt byggestop i Iergraven midt i landsbyen Kølby. I hvert fald, så er indbyggerne i Aalborg Kommunes vestligste bebyggelse på lørdag klar til at indvi deres nye samlingssted, en smuk træpavillon, der har været undervejs siden første spadestik en råkold og fugtig februardag i år.

Før formanden for den lokale borgerforening, Lars Andersen, der i den netop overståede weekend sammen med et byggeteam har lagt sidste hånd på pavillonbyggeriet, er det kronen på værket, og han er meget tilfreds med resultatet, en ottekantet naturtræsbygning med masser af albuerum og muligheder for lokale aktiviteter.

Lars Andersen er også glad for den støtte man har opnået fra Aalborg Kommune, LINK, samt andre sponsorer, og han opfatter ikke tilslutningen til mastodontkommunen som negativt.

Jeg føler ikke, at vor situation er blevet ringere af at komme med i storkommunen, mener Lars Andersen, der venter stor tilslutning, når pavillonen på lørdag skal indvies.


Fra Aalborg Kommune har Anna Kirstine Olesen meldt sin ankomst, og når hun har foretaget snørklipningen, så er der dømt legedag i det smukke anlæg, både for børn og voksne.

Lørdag aften er der så fest i pavillonen med spisning og levende musik.



LARS ANDERSEN, formand for Kølby Borgerforening og en af hovedmændene bag pavillonbyggeriet, har fat i en af de sidste vægbrædder i savskåret naturtræ. Han ser nu frem til indvielsesfesten på lørdag.

18/8-08
Nordjylland

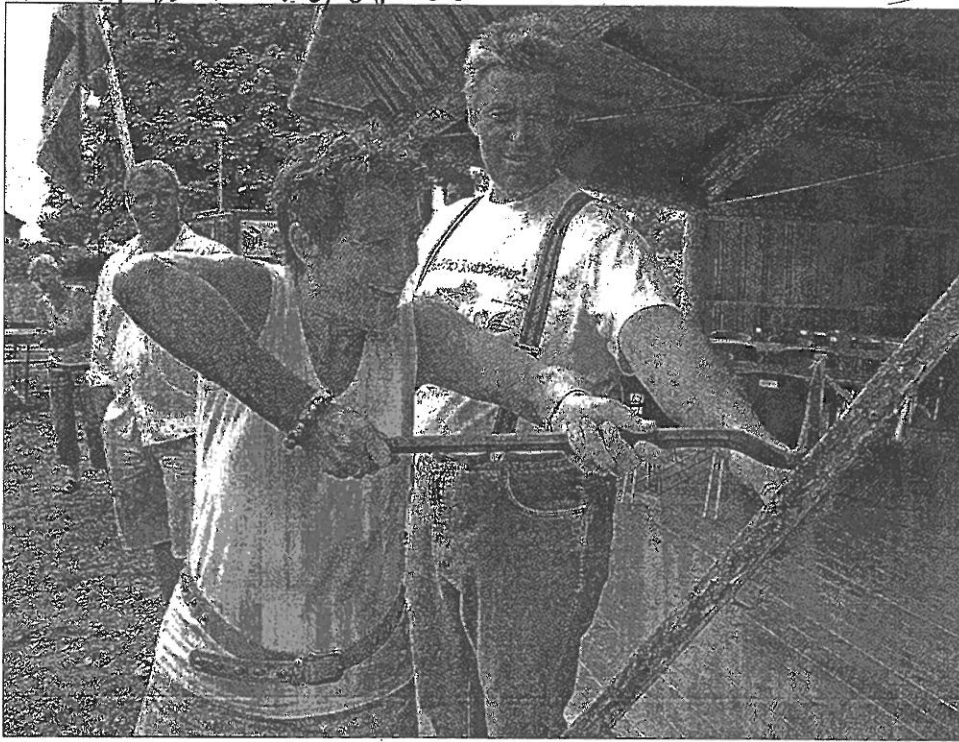

ANNA KIRSTEN Olesen (S) fra Aalborg Byråd fik ikke lov til at klippe snore, for i Kølby gør man det anderledes. I stedet skulle hun som symbol på pavillonens åbning trække et søm ud af en overskudsplanke fra vægbeklædningen. Formand for den lokale borgerforening Lars Andersen ser til.

Foto: Flemming Møller

Indvielse trak søm ud

KØLBY: Normalt foregår indvielser af bygninger ved snorklipning. Men i Kølby helt ude mod vest i Aalborg Kommune går man andre veje.

Her fik Anna Kirsten Olesen, kommunens repræsentant ved indvielsen af den ny pavillon i Lergravens midt i byens hjerte, lørdag eftermiddag ikke lov til at klippe nogen snor. I stedet skulle hun med et køben trække et søm ud af en tilbageværende vægplanke som symbol på, at landsbyens pavillon nu er endelig færdig og klar til brug. En opgave, der blev udført med nærmest håndværksmæssig præcision.

Det foregik i overværelse af et halvt hundrede af Kølby's i alt 208 indbyggere, og bifaldet var til at høre på denne sensommer-solbeskinnede eftermiddag, hvor den ofte på disse kanter hængende vestenvind holdt pause.

Efter at borgerforeningens



KLAR TIL landsbydyst i disciplinen blindkørsel med trillebør.

indsats, fastslog hun, idet hun fremhævede sammenholdet i Kølby som ganske unikt i den store kommune, hvor hun ikke kender nogen steder, hvor så relativt få mennesker kan få ting til at ske.

Fra nabolandsbyen Farstrup var formand fra bor-

kom ikke tomhændet, idet han medbragte en check på kr. 20.000 til pavillonens.

Efterfølgende vandt Kølby landsbydysten mod Farstrup, og om aftenen forsamledes man til grillefest og bal med musik fra Seberbandet The Ålerusers. Flemø

Kølby indviede den nye pavillon i Lergravene

blev den nybyggede pavillon i Lergravene indviet.

mentet startede i et solskinsvejr, og formanden for Kølby og omegns Borgerforening Lars Andersen velkommer til de ca. 100 mødte voksne og børn, og gav straks ordet til formandens gruppe.

formand i Aalborg Byråd, Anna Kirsten Olesen.

Hun holdt tale om det vigtige i et godt sammenhold blandt borgerne i de små samfund og hun roste meget det flotte resultat der er kommet ud af det og den flotte hjemmeside byen har.

Selve indvielsen foretog Anna Kirsten Olesen ved

med et kobben at trække et søm ud af en planke.

Herefter tog formanden for Farstrup Borgerforening Morten Bøjer ordet og gratulerede på festlig vis Kølby med den nye Pavillon og overrakte samtidig en plade til indgravering af navn. Også Arne Segerstrøm fra Sparekassen Himmerland

ønskede til lykke og havde en check med på kr. 20.000,- fra Sparekassen Himmerlands Gavefond. Farstrup Boldklub overrakte et smukt glasfad som gave til Kølby og omegns Borgerforening.

I dagens anledning fik publikum lejlighed til at brænde sit navn ind i pavillonens store midtersøjle.


Næste punkt i programmet var landsbydykst med bl.a. trillebørstafet, støvlekast, skilpaddeløb, opgaver med klodser og vand samt tovtrækning. Kølby's hold vandt med et enkelt point over Farstrup, og begge hold fik overrakt flotte pokaler. Herefter blev der traditionen tro spillet rundbold.

Alle havde en sjov eftermiddag og kunne bagefter nyde forfriskninger i pavillonens. Dagen sluttede med en hyggelig aftenfest med grilsteget gris og underholdning af The Alerusers.

Cecilie (Cille) Krogshave fik som den første lejlighed til at brænde sit navn i pavillonens kraftige, bærende midtersøjle.



Anna Kirsten Olesen markerede åbningen af den nye Kølby Pavillon ved at trække et søm ud af kobben, med et kobben. Her får hun hjælp fra borgerforeningens formand Lars Andersen.

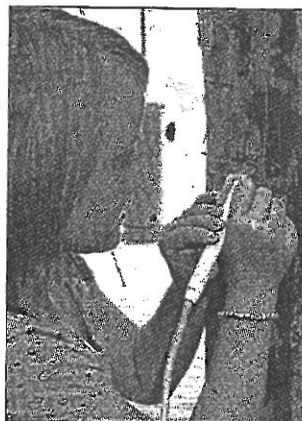

7.

Opgørelse pavillon byggeri

		udbetaling
Holbech arkitektstue	udarbejdelse af tegninger	kr 6.250,00
Nibe kommune	byggetilladelse	kr 2.250,00
S.B.G. Entreprise	udgrav. og støb. af fundamenter	kr 68.750,00
Per Svenstrup	lev. af sand + opstampning	kr 6.250,00
Rejsegilde	Pølser + øl og vand	kr 1.329,75
NA Byg	opsæt.af bærende stolper og tag	kr 200.000,00
rest NA Byg	oplægning af tag	kr 112.810,00
NA Byg ekstra	tagvinduer	kr 12.500,00
NA Byg ekstra	ekstra stople + fragt	kr 4.176,50
Fausing Savværk	kalmarbrædder til sider + kantstolper	kr 8.272,00
Leo og Jørgen Anedersen	fragt af kalmarbrædder	kr 2.000,00
XL Byg Løgstør	gulvbelægning + strøer	kr 30.631,39
Henriksen og Madsen	cement, mursten og fliser under strøer	kr 1.510,50
XL Byg Løgstør	rigeltræ til skellet sider + dørbeslag	kr 2.253,21
Biltema	skruer og beslag	kr 816,20
Jørgen Pedersen	søm for gulvbrædder	kr 1.004,00
Biltema	Vire og stropper for presseninger	kr 282,00
Oudrup Stenleje	sten til opfyld langs fundament	kr 1.435,00
Nord forsikring	arbejdsskadeforsikring + byggeforsikring	kr 2.694,82
Samlede udgifter til pavillonbyggeri		kr 465.215,37

Finansering

- *Støtte fra Aalborg Kommunes Fyrtårnsprojekt* *Kr. 370.000,00*
- *Støtte fra Sparekassen Himmerlands Gavefond* *Kr. 20.000,00*
- *Kølby og Omengs Borgerforening, kassekredit* *Kr. 75.215,37*

8.

Evaluering

Hvad gik godt og hvad gik mindre godt. Hvad lærte vi?

Vi har lært at der skulle have været mere styr på håndværkernes specifikation. Således fandt vi med tiden ud af at der var materialer vi selv måtte indkøbe.

Arbejdet med dette projekt har til tider været hårdt og tidskrævende for mange. Vi skulle nok have haft mere styr på hvilke frivillige der ville hjælpe til, det var vanskeligt at lave en egentlig planlægning. Vejret spillede til tider en stor rolle. Men vi oplevede at mange gerne hjalp til hvis tiden tillod det, og det krævede oftest bare et telefonopkald eller to.

Det er dog på trods alles opfattelse at det har været hele sliddet værd. Vi er i dag både stolte og lykkelige for den flotte pavillon der nu stå færdig.

Vi vil gerne med denne rapport sige tak til Sundhed og Bæredygtig Udvikling for opbakningen der gjorde det muligt for os at gøre ide til virkelighed.

Kølby og Omegns Borgerforening
