Fodring i perioden 2004-2008

Figur 3

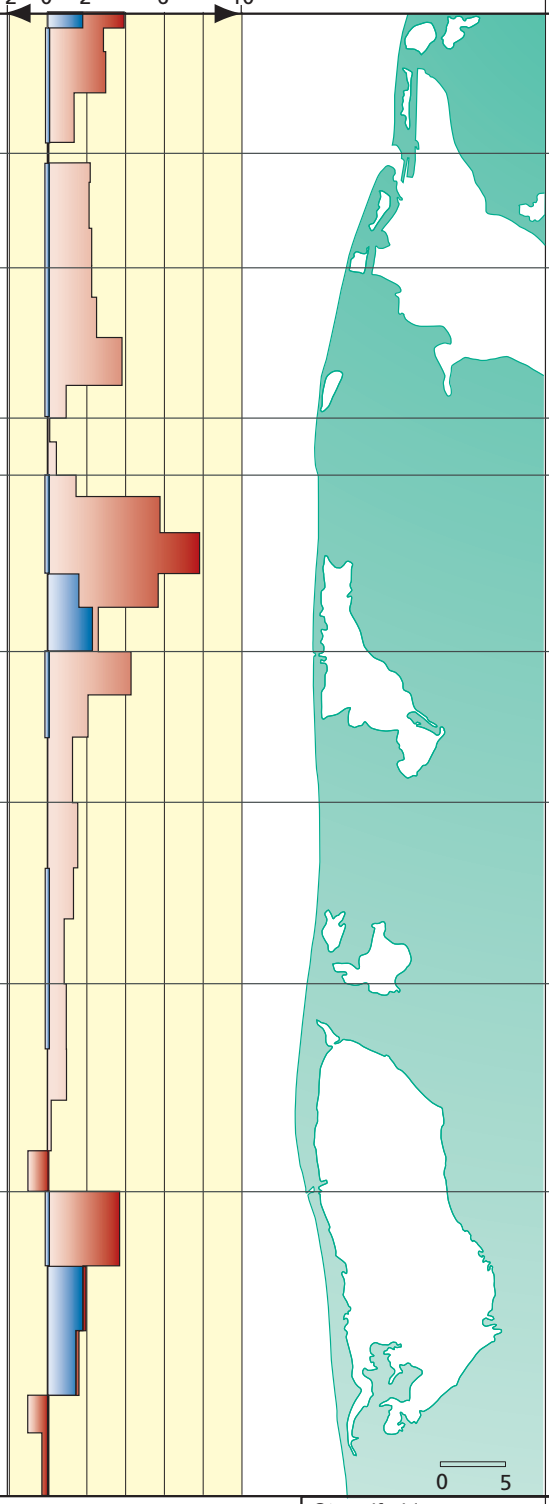

Hovedstrækning	Mængde (1000 m³) 2004	2005	2006	2007	2008	Gnm. snit
Agger Tange		369 252		323	327	254
Harboøre Tange	421	4 302	200	191 54	136 129	287
Vrist - Ferring	612	656	373	410	200	450
Bovbjerg Klint						
Trans - Thorsminde	622	249	609		173	331
Thorsminde - Husby Klitplantage	87 20 98	397	18 283	143	453	300
Husby Klitplantage - Søndervig		331		892	109	266
Ndr. Holmsland Tange	88	552	275			183
Sdr. Holmsland Tange	95 600	192 200	146 505	172 300	362	514
Strandfodring	270	2.750	164	1.240	1.560	1.197
Strandnær fodring	1.053	554	856	54	329	569
Revlefodring	1.320	200	1.389	1.192	0	820
Samlet fodring	2.643	3.504	2.409	2.485	1.889	2.586

Beregnet naturlig årlig tilbagerykning 1977-96

Målsætning for maksimal årlig tilbagerykning

KYSTDIREKTORATET, den 27.05.2008
Gr. 103-x-65 Nr. 652
