Handle- og tidsplan for miljøoprydning i Grønnedal

Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato
1	**Tilpasning af bygningsmassen**	**211,2 uger**	**on 18-07-18**	**fr 29-07-22**
2	**Fase 1: "Halv tolv" området (18 bygninger)**	**56 uger**	**on 18-07-18**	**fr 09-08-19**
6	**Fase 2**	**134,6 uger**	**on 01-01-20**	**fr 29-07-22**
7	Plan for tilpasning af bygningsmasse	17,08 uger	on 01-01-20	fr 21-05-21
8	**Implementering fase 2 - Bygning 24 og 54**	**62 uger**	**ma 24-05-21**	**fr 29-07-22**
9	Kommunqarfik Sermersooq indhenter Rådgiver	5 uger	ma 24-05-21	fr 25-06-21
10	Besigtigelse og screening af bygninger	0,6 uger	ma 28-06-21	on 30-06-21
11	Projektering	14 uger	to 01-07-21	on 06-10-21
12	udbud m. besigtigelse	4 uger	to 07-10-21	on 03-11-21
13	Licitation	0,2 uger	to 04-11-21	to 04-11-21
14	**Udførelse**	**38,2 uger**	**fr 05-11-21**	**fr 29-07-22**
15	Sanering	2 uger	fr 05-11-21	to 18-11-21
16	Nedrivning	6 uger	ma 06-06-22	fr 15-07-22
17	Reetablering	2 uger	ma 18-07-22	fr 29-07-22
18	**Pilotforsøg: Lupinbekæmpelse**	**182,6 uger**	**ti 26-06-18**	**ma 20-12-21**
19	**Udførelse**	**62,2 uger**	**ti 26-06-18**	**to 29-08-19**
22	**Rapportering**	**117,6 uger**	**ma 03-09-18**	**fr 27-11-20**
26	Drøftelse i styreguppen	0,2 uger	ma 20-09-21	ma 20-09-21
27	FES bearbejder anbefaling på baggrund af Rapport fra 2019	7,2 uger	fr 01-10-21	fr 19-11-21
28	Drøftelse i styreguppen	0,2 uger	ma 22-11-21	ma 22-11-21
29	Udarbejdelse af plan for bekæmpelse FES/AKO	4 uger	ti 23-11-21	ma 20-12-21
30	**Forberedelse af plan for håndtering af forureninger**	**226,8 uger**	**ma 01-10-18**	**to 26-01-23**
31	**Moniteringer (Fortsættes også efter 2023)**	**226,8 uger**	**ma 01-10-18**	**to 26-01-23**
32	**Prøvetagning**	**210,4 uger**	**ma 01-10-18**	**on 05-10-22**
38	**Rapportering**	**224,6 uger**	**ma 15-10-18**	**to 26-01-23**
44	**Pilotforsøg: Termisk oprensning**	**61,2 uger**	**to 01-11-18**	**ti 31-12-19**
45	**Projektering**	**26,4 uger**	**to 01-11-18**	**fr 03-05-19**
46	Detailprojektering (rådgiver)	3 uger	to 01-11-18	on 21-11-18
47	Gennemsyn/drøftelse ved FMN og grønlandske myndigheder	1,6 uger	ti 27-11-18	to 06-12-18
48	VVM anmeldelse og ansøgning om miljøgodkendelse til behandling hos Selvstyret	16,6 uger	on 19-12-18	fr 03-05-19
49	Entreprenørudbud	8,4 uger	to 21-03-19	on 19-06-19
50	**Udførelse**	**40,2 uger**	**fr 17-05-19**	**on 19-02-20**
54	**Hydrogeologiske undersøgelser**	**51,8 uger**	**ma 07-01-19**	**ti 31-12-19**
55	Oplæg til undersøgelse	2 uger	ma 07-01-19	fr 18-01-19
56	Gennemsyn/drøftelse ved FMN og grønlandske myndigheder	2 uger	on 23-01-19	ti 05-02-19
57	Rådgiverudbud	7,2 uger	ma 04-03-19	ma 22-04-19
58	**Planlægning**	**6,4 uger**	**to 09-05-19**	**fr 21-06-19**
61	Entreprenørudbud	6,2 uger	ma 27-05-19	ma 08-07-19
62	**Udførelse**	**36,4 uger**	**ma 01-07-19**	**fr 06-03-20**
66	**Følgegruppe besigtigelser**	**0,8 uger**	**ti 10-09-19**	**fr 13-09-19**
67	Besigtigelse nr. 2	0,8 uger	ti 10-09-19	fr 13-09-19
68	Evt. besigtigelse nr. 3	0,8 uger	ti 06-09-22	fr 09-09-22
69	**Valg af metoder til håndtering af olieforureninger**	**183,4 uger**	**ti 26-06-18**	**fr 24-12-21**
70	**Plan for håndtering af olieforureninger**	**179,4 uger**	**ti 26-06-18**	**fr 26-11-21**
71	**Workshop nr. 1**	**1,4 uger**	**ma 08-06-20**	**ti 16-06-20**
74	**Konceptuelle modeller for indsatsområder**	**118,8 uger**	**ti 26-06-18**	**ti 29-09-20**
77	**Workshop nr. 2**	**0,4 uger**	**on 16-06-21**	**to 17-06-21**
79	**Udarbejdelse af samlet plan for håndtering af olieforureninger**	**14 uger**	**ma 09-08-21**	**fr 12-11-21**
80	Samlet plan for alle indsatsområder	10 uger	ma 09-08-21	fr 15-10-21
81	Følgegruppe orientering efter workshop nr.2 (Fysisk møde i København)	0,4 uger	to 23-09-21	fr 24-09-21
82	Drøftelser med Sermersooq Kommune mfl. Vedr. mulige oprensningsmetoder.	3 uger	ma 27-09-21	fr 15-10-21
83	Plan til bearbejdning hos FES/FMN	2 uger	ma 18-10-21	fr 29-10-21
84	Færdiggørelse af plan	4 uger	ma 01-11-21	fr 26-11-21
85	**Drøftelser i følgegruppen**	**4 uger**	**ma 29-11-21**	**fr 24-12-21**
86	Fremlæggelse af plan for håndtering af olieforureninger (Fysisk møde i Nuuk)	3 dage	ma 29-11-21	on 01-12-21
87	Opfølgninng på fysisk møde i Nuuk.	4 uger	ma 29-11-21	fr 24-12-21
88	**Iværksættelse af miljøoprydning af olieforurening (afhænger af drøftelser i følgegruppen)**	**130 uger**	**ma 03-01-22**	**on 26-06-24**
89	**Projektering**	**56 uger**	**ma 03-01-22**	**on 25-01-23**
90	Rådgiverudbud m. besigtigelse	32 uger	ma 03-01-22	fr 12-08-22
91	Projektering og udbudsmateriale	24 uger	ma 15-08-22	on 25-01-23
92	**Myndighedstilladelser**	**28 uger**	**ma 24-10-22**	**fr 05-05-23**
93	Ansøgning	8 uger	ma 24-10-22	fr 16-12-22
94	Godkendelse	20 uger	ma 19-12-22	fr 05-05-23
95	**Entreprise**	**32 uger**	**ma 08-05-23**	**fr 15-12-23**
96	Udbud m. besigtigelse	30 uger	ma 08-05-23	fr 01-12-23
97	Standstill	2 uger	ma 04-12-23	fr 15-12-23
98	**Start på udførelse**	**8,2 uger**	**ma 01-04-24**	**ma 27-05-24**
99	Forberedelse	4 uger	on 01-05-24	ti 28-05-24
100	Mobilisering	4 uger	on 29-05-24	ti 25-06-24
101	Opstart	1 dag	on 26-06-24	on 26-06-24

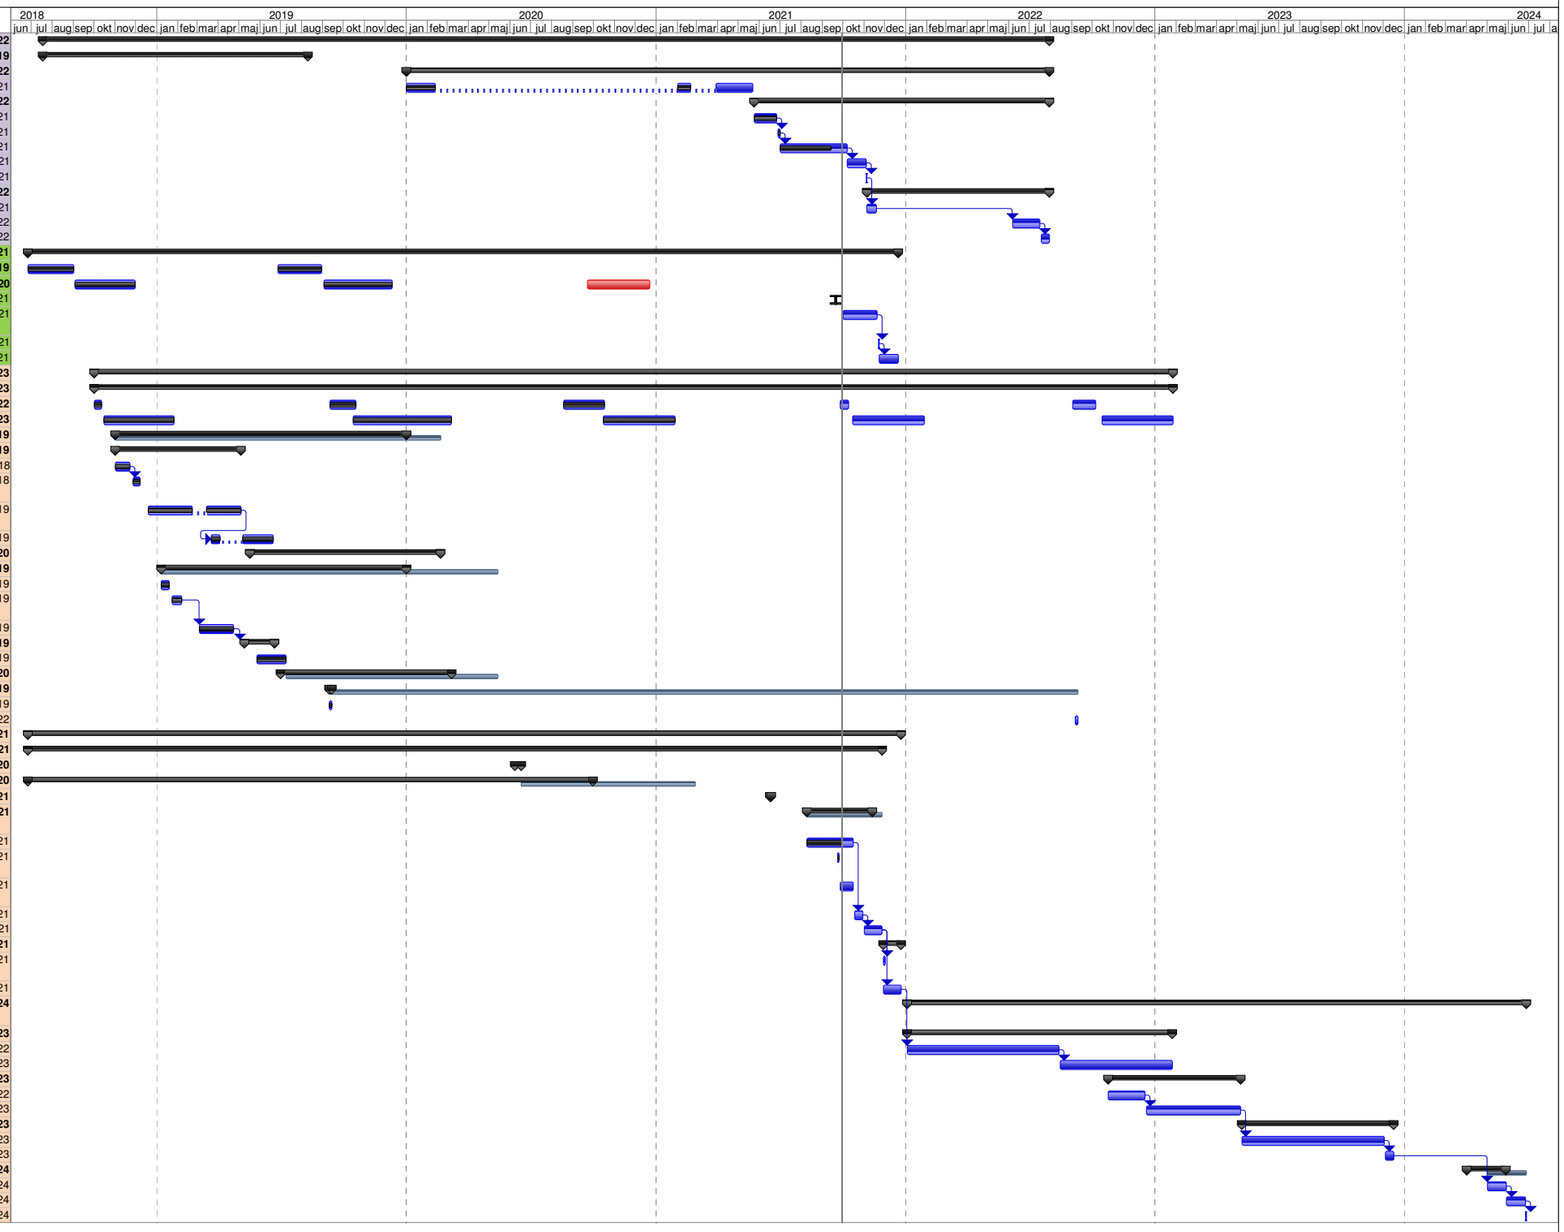

Projekt: Grønnedal_Miljøhandle-og-tid
Dato: to 30-09-21

Opgave		Oversigt		Ekstern milepæl		Inaktiv oversigt		Manuel oversigtsopløftning		Kun slutdato	
Opdeling		Projektoversigt		Inaktiv opgave		Manuel opgave		Manuel oversigt		Fremdrift	
Milepæl		Eksterne opgaver		Inaktiv milepæl		Kun varighed		kun start		Deadline	
