



Det Enerkipolitiske Udvalg  
EPU alm. del - Bilag 13  
Offentligt

Holstebro den 11. oktober 2007.

Det Enerkipolitiske Udvalg (EPU)  
Folketinget, Christiansborg  
1240 København K.



## ***Vi kan snart ikke mere !***

Maabjerg BioEnergy er lige nu inde i en fase hvor der kræves ekstra hjælp til at få dette projekt realiseret.

Planlægning og projektering har nu taget mere end 5 år – vi har i dag et gennemarbejdet projekt, der løser en lang række af de udfordringer, der er højt prioriteret i Miljøministeriet, Fødevareministeriet og Transport & Energiministeriet – et projekt der kan sikre et erhvervsgrundlag og bosættelse i vores region.

Der har været stor opbakning til projektet i alle årene, men processen har taget alt for lang tid, ikke mindst den politiske del.

Hvis Maabjerg BioEnergy (og andre tilsvarende projekter) skal blive en realitet er det nødvendigt, at der snarest skabes nogle rammebetingelser på energiområdet der sikre rimelige økonomiske betingelser.

For Maabjerg BioEnergi (og andre tilsvarende projekter) skal der snarest findes en løsning så afbrænding af husdyrgødningens fiberdel kan ske efter Biomassebekendtgørelsen bestemmelser.

### **Projektstatus:**

#### **Juni 2002**

- Idefase

#### **Juni 2003**

- Udarbejdelse af konceptstudie

#### **December 2003**

- Ansøgning til EU's Concerto-program

#### **Juni 2004**

- Maabjerg BioEnergy udvælges til deltagelse i Concerto

#### **August 2004**

- Planfasestudie afsluttes, projektet er godt, men kan kun realiseres hvis husdyrgødningens fiberfraktion kan afbrændes, hvilket kræver lovændring.

- Miljøministeren kontaktes for ændring af lovgivning – det meddeles at der nedsættes et hurtigt arbejdende embedsmandsudvalg.

#### **Oktober 2004**

- Myndighedsbehandling indledes af Ringkøbing Amt.

#### **Februar 2005**

- Maabjerg BioEnergy afslutter forhandlinger med Concerto. Mange af de arbejdsopgaver der oprindeligt var beskrevet i ansøgningen ændres efter krav fra EU.

#### **April 2005**

- Miljøministerens hurtigt arbejdende udvalg begynder sit arbejde.
- Maabjerg BioEnergy mødes med Det Energitpolitiske Udvalg på Christiansborg.

#### **Juni 2005**

- Embedsudvalget afleverer deres indstilling til regeringen med en anbefaling om at ændre lovgivningen.
- Regeringen beslutter at foretage de anbefalede lovændringer.

#### **September 2005**

- Maabjerg BioEnergy underskriver kontrakt med EU's Concerto-program med tilsagn om støtte på i alt ca. 28 mill. kr. over 4 år.

#### **August 2006**

- Ændring af Gødningsloven og Husdyrbekendtgørelsen er gennemført.
- Afventer fortsat EU's notificering af afgiftsfritagelse for afbrænding af fiber.

#### **September 2006**

- EU prækvalificering

#### **Oktober 2006**

- Det samlede og meget detaljerede udbudsmateriale er udarbejdet.

#### **November 2006**

- 9 firmaer meddeler interesse i at indgå forhandlinger om byggeri af Maabjerg BioEnergy.
- Maabjerg BioEnergy meddeler 3 firmaer at de er prækvalificerede.

#### **December 2006**

- Intern opdatering af projektøkonomien viser at investeringen er ca. 100 mill. kr. højere end tidligere antaget og anslås nu at blive 380 mill. kr. En stor del af stigning kan henføres til stærkt stigende priser på verdensmarkedet p.g.a. af den lange projekteringsperiode samt kravet om at fiberfraktionen skal afbrændes efter affaldsforbrændingsdirektivet.

#### **Januar 2007**

- Det meddeles at EU har notificeret afgiftsfritagelsen.
- Maabjerg BioEnergy besluttede at stille projektet i bero p.g.a. manglende rentabilitet med de nuværende rammebetingelser.
- Statsministeren fremlægger "En visionær dansk energipolitik 2025" med en forventning om bl.a. 50 "store" biogasanlæg.
- Det besluttes at lade myndighedsbehandlingen fortsætte – da dette arbejde forventes at vare yderligere 1 – 2 år inden alle tilladelser er indhentet.

#### **Marts 2007**

- Maabjerg BioEnergy har begrundede forventninger om, at der opnås enighed i Folketinget om nye forbedrede rammebetingelser for biogas inden udgangen af juni 2007. Betingelser der forhåbentligt igen vil gøre Maabjerg BioEnergy rentable hvis de politiske forventningerne om 50 "store" anlæg skal være etableret i 2025.

### Juni 2007

- Forhandlingerne i Folketinget strander.

### Oktober 2007

- Det forlyder, at der ikke forventes enighed i Folketinget om rammebetingelserne før ved udgangen af 2007.
- Maabjerg BioEnergy deltager i Concerto's midtvejsmøde i Bruxelles og forespørger kommissionen om muligheden for at forlænge kontraktperioden med mindst et år. Vores projekt officer Alexandros Kotranaros meddeler mundtligt at det skal vi ikke forvente og at han ikke tror på vores projekt, men at vi må stille spørgsmålet skriftligt til kommissionen. Ved mødet blev fremlagt et notat fra Skatteministeren samt en tidslinie der beskriver projektførelsen, men det ændrede ikke projekt officerens opfattelse (vedlagt som bilag). Maabjerg BioEnergy har indtil nu modtaget 11 mill. kr. i forskud fra Concerto, der står spærret i en dansk bank og kan ikke anvendes.

### November 2007

- Holstebro Kommunes miljøafdeling forventer at fremlægge den samlede myndighedsansøgning, der startede i oktober 2004, for Byrådet i Holstebro (Miljøansøgning, VVM-redegørelse, Varmeplan m.m.). Det forventes at Byrådet sender forslagene i offentlig høring i 2 måneder og hvis der ikke sker indsigelser vil tilladelser kunne foreligge i foråret 2008. Hvis der sker indsigelser er tidspunktet for tilladelse ukendt.

Maabjerg BioEnergy har indtil nu brugt mere end 15 mill. kr. – langt overvejende betalt af projektets aktionærer hvoraf landmændene udgør 51% - desuden en meget stor frivillig og ubetalt indsats fra mange ildsjæle, men nu er vi ved at tabe biogassen.

Grunden til at vi ikke har givet op i processen er dels fordi vi synes det er et samfundsnyttigt projekt som det er værd at kæmpe for, og ikke mindst fordi der igennem hele forløbet har været dokumenterbart opbakning til projektet og til at nedbryde de barrierer der har været fra alle Folketingets partier.

Hvis Danmark virkelig ønsker at sikre en fortsat stor husdyrproduktion der er miljøvenlig og delvis lugtfri, at bevare arbejdspladser, at øge den danske forsyning af vedvarende energi og reducerer udledning af CO2 at kunne fremvise noget virkeligt miljøteknologi som Maabjerg BioEnergy ved Klimakonferencen i 2009 – **så skal der ske noget nu !**

Med venlig hilsen

Martin Merrild

  
Alan Lunde



SKATTEMINISTERIET

Martin Merrild  
Maabjerg BioEnergy  
Nupark 51  
7500 Holstebro

INDGÅET

19 APR. 2006



Minister for Taxation

Nicolai Eigtveds Gade 28  
DK - 1402 København K

Phone +45 3392 3392  
Fax 3314 9105

CVR-nr. 17146815  
EAN-nr. 5798000033757

www.skm.dk

Ref.no. 2005-231-0051

Dear Martin Merrild

18 APR. 2006


I would like to express my regret for the economic insecurities inflicted on Maabjerg BioEnergy, as an effect of the extended time involved with the processing of the Governments proposal to exempt the incineration of fibre fraction from the Danish Waste tax.

The reason for the time extension was a need to finish an intergovernmental study of the effects of incinerating household manure in general, as a background for determining the scope of the tax exemption. Following the report it was decided to delimit the scope of the exemption to the incineration of fibre fraction, deriving from degassed and separated livestock manure.


The proposal has now been through the first reading in Parliament and a broad majority seems to be behind the proposal.

I need to stress, that the proposal will not be put into force before the EU Commission has accepted it according to the Treaty rules on state aid.


Yours sincerely

  
Kristian Jensen

Directorate-General Energy and Transport



CONCERTO 

  
**ECOSTILER**



PC Meeting  
Brussels

1<sup>st</sup> October 2007




MAABJERG  
BIOENERGY

# - time line for project development and

## Important activities / milestones



○ MBE: Development of idea † MBE: Concept study

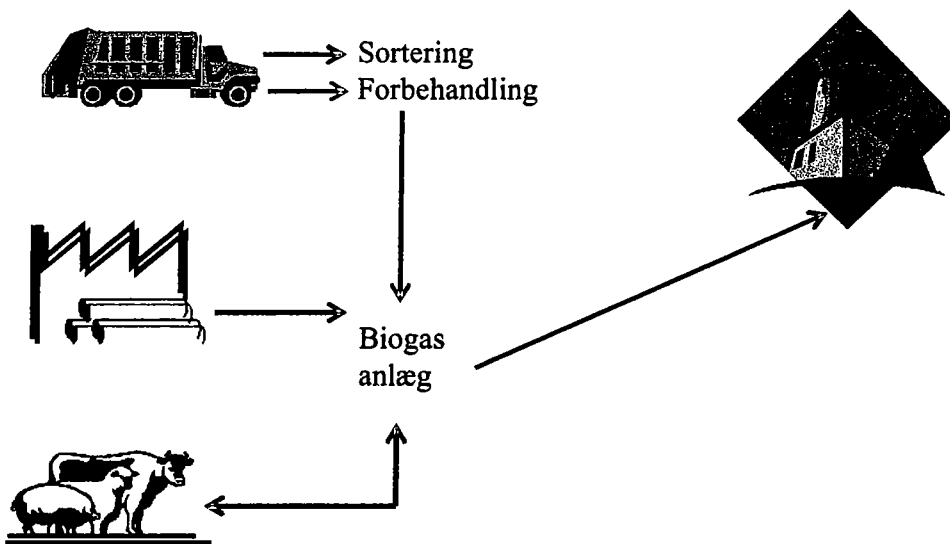


←  
Pr

● ap



# and project implementation

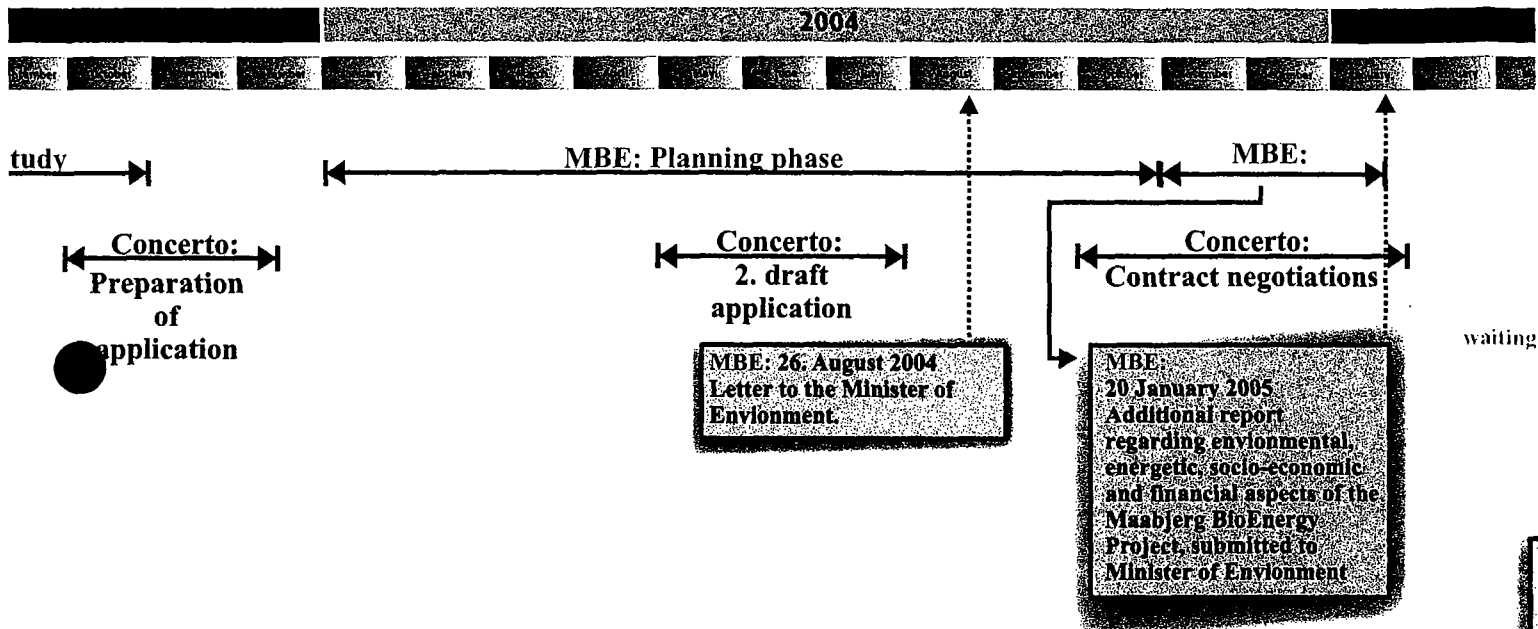

2005

2006

April May June July

MBE: Additional preparatory work

Design phase; preparatory negotiations with buyers and update on project

**Concerto:  
Signing of  
ECOSTILER  
Contract**

**Danish Government**

waiting  
Intergovernmental working group, established, assuring the legal and economic issues, raised by Maabjerg BioEnergy.

**Danish Government:  
June 2006  
National legislation in place.  
(However, tax exemption law needs to be notified in EU).**

**Danish Government:  
9. June 2005  
Decision regarding promotion of the MBE-concept through additional legislation.**

**SKATTEMINISTERIET**

INDGÅET  
19 APR. 2006

VERSFØRNING

Martin Merrild  
Maabjerg BioEnergy  
Nupark 51  
7500 Holstebro

Dear Martin Merrild

I would like to express my regret for the economic insecurities inflicted on Maabjerg BioEnergy, as an effect of the extended time involved with the processing of the Governments proposal to exempt the incineration of fibre fraction from the Danish Waste tax.

The reason for the time extension was a need to finish an intergovernmental study of the effects of incinerating household manure in general, as a background for determining the scope of the tax exemption. Following the report it was decided to delimit the scope of the exemption to the incineration of fibre fraction, deriving from degassed and separated livestock manure.

The proposal has now been through the first reading in Parliament and a broad majority seems to be behind the proposal.

I need to stress, that the proposal will not be put into force before the EU Commission has accepted it according to the Treaty rules on state aid.

Yours sincerely  
*Kristian Jensen*  
Kristian Jensen

*Alan's*

*Eud. dinsten 2001/77*

EUROPA-KOMMISSIONEN  
GENERALSEKRETARIAT

Bruxelles, den  
SG-Greffe (2007) I

DANMARKS FAS  
VED DE EUROPÆ  
73, rue d'Artois  
1049 - BRUXELLES

FÆLLESREPRÆSENTATIONEN BRYSSEL  
1 BILAG  
- 5 JAN. 2007  
*400. W. 13-1*  
*hp.d.u*

Angående: Statsstøttesag nr. N 147/2006 - Danmark

Generalsekretariatet sender Dem vedlagt beslutningen fra K ovennævnte emne til vidresendelse til Udenrigsministeriet.

For general  
*90 Karl VOI*

Bilag: K(2007)1



2007

**MBE:**

Preparation of tender documents;  
Buyers of energy from MBE;  
Project economy.

**EU: 3. January 2007**  
Notification of tax  
exemption rules.

**MBE Board:**  
Decision to await  
results of national  
Energy Reform  
before tendering  
the project.

**Danish Government**  
Negotiations regarding  
national energy reform

Negotiations  
put on hold

**Danish Government:**  
Completion of negotiation regarding  
national energy reform

**MBE Board:**  
Decision regarding  
prequalification  
and tendering  
of the project.

1/27/SE  
ARTIKEL 65 PAR 1

041 2007  
L. des  
E (2007) Nr 200019

RKS FASTE REPRESENTATION  
EUROPEISKE UNION  
Arlon  
LUXELLES

ark  
gen fra Kommissionen angående  
sagen.  
For generalsekretæren  
Karl VON KEMPIS

© Brussel - Belgien, Telefon: (32-2) 298 11 11

Preparation for approval and permits from the local authorities



2008

January February March April May June July August September October November December January February March April May June


**MBE / Authorities:**  
Final approval and permits from authorities in place.

**MBE:** Contracting with supplier, based on a tender process.

# Visitor Center

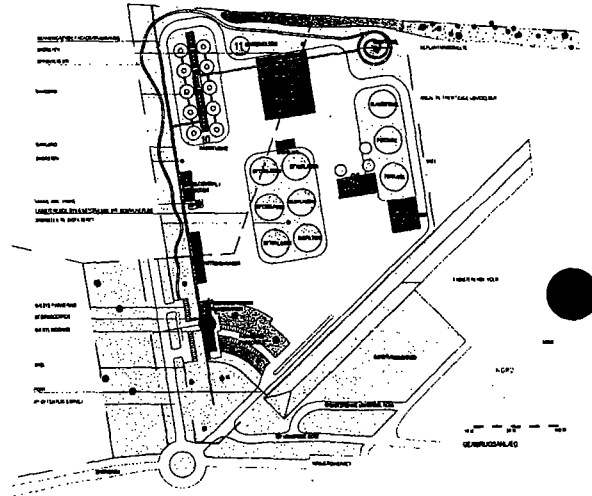

30. November - 11. December  
COP15  
United Nations  
Climate Change Conference  
Copenhagen 2009



June July August September October November December January February March April May June July August



**MBE:  
Operation  
START UP**

**MBE:  
Transfer to  
regular  
operation**

