




Oversigt: fra forundersøgelse til anlægsprojekt

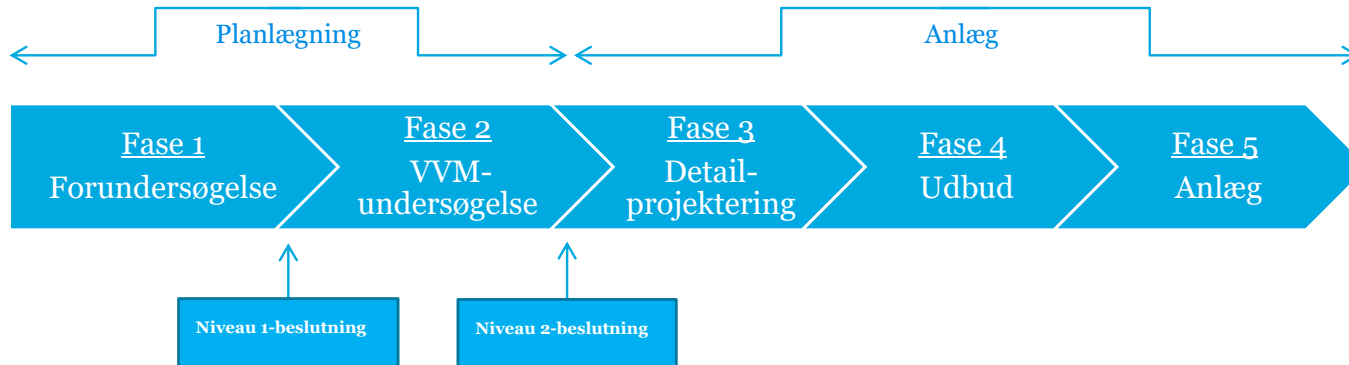

Fase 1 - Forundersøgelse

- Fysikpris er usikker og vurderes ofte for lav.
- Derefter tilføjes korrektionstillæg på 50 pct.
- Ekstern kvalitetssikring

} **Stiliseret eksempel:** Fysikpris 70 mio. kr.
Samlet anlægsoverslag $1,5 \times 70$ mio. kr. = 105 mio. kr.

Fase 2 – VVM-undersøgelse/beslutningsoplæg

- Fysikpris er mere sikker
- Derefter et korrektionstillæg på 30 pct.
- Igangsættes ved politisk beslutning (niveau 1-beslutning i diagrammet).
- VVM-undersøgelse underlægges ekstern kvalitetssikring og korrektionstillæg på 30 pct. tilføjes
- Anlægslov indeholder projektbevilling (10 pct. i bevilget reserve – 20 pct. i central reserve)

} **Stiliseret eksempel:** Fysikpris nu 80,7 mio. kr.
Samlet anlægsoverslag $1,3 \times 80,7$ mio. kr. = 105 mio. kr.

Fase 3-5 – Anlæg

- Igangsættes ved politisk beslutning/vedtagelse af anlægslov (niveau 2-beslutning i diagrammet)
